

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目
(阶段性)

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位： 麻城市达富石业有限公司
编制单位： 麻城市达富石业有限公司

2025 年 7 月

建设单位法人代表：	(签字)
编制单位法人代表：	(签字)
项 目 负 责 人 ：	
填 表 人 ：	

建设单位
(盖章) : 麻城市达富石业有限公司

电 话 : 15605088500

传 真 : /

邮 编 : 438300

地 址 : 湖北省黄冈市麻城市中部石材产
业园 L09 号

编制单位
(盖章) : 麻城市达富石业有限公司

电 话 : 15605088500

传 真 : /

邮 编 : 438300

地 址 : 湖北省黄冈市麻城市中部石材产
业园 L09 号

目 录

表一	项目概况，验收监测依据，验收监测评价标准、标号、级别、限值	1
表二	工程建设内容，原辅材料消耗及水平衡，主要工艺流程及产污环节	3
表三	主要污染源、污染物处理和排放	13
表四	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	17
表五	验收监测质量保证及质量控制	21
表六	验收监测内容	22
表七	验收监测期间生产工况记录，验收监测结果	23
表八	验收监测结论	24
附表		27

附件

- 附件 1： 营业执照
- 附件 2： 环评批复
- 附件 3： 排污许可证
- 附件 4： 突发环境事件应急预案备案表
- 附件 5： 环境管理制度
- 附件 6： 危险废物管理承诺书
- 附件 7： 一般固废（边角料、尾渣）处置协议
- 附件 8： 一般固废管理台账
- 附件 9： 危险废物管理台账
- 附件 10： 废水排放情况说明书
- 附件 11： 生活污水综合利用协议书
- 附件 12： 工况说明
- 附件 13： 验收监测报告
- 附件 14： 其他需要说明的事项
- 附件 15： 验收意见及签到表
- 附件 16： 验收公示文件

附图

- 附图 1： 地理位置图
- 附图 2： 平面布置图
- 附图 3： 周边关系图
- 附图 4： 监测点位图

表一

建设项目名称	麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目				
建设单位名称	麻城市达富石业有限公司				
建设项目性质	☐ 新建 ☒ 改扩建 ☐ 技改 ☐ 迁建				
建设地点	湖北省黄冈市麻城市中部石材产业园 L09 号				
主要产品名称	花岗岩石板材				
设计生产能力	年增产石板材 50 万平方米				
实际生产能力	年增产石板材 30 万平方米				
建设项目环评时间	2025 年 4 月	开工建设时间	2025 年 5 月		
调试时间	2025 年 6 月	验收现场监测时间	2025 年 6 月 22 日-23 日		
环评报告表 审批部门	黄冈市生态环境局麻城市 分局	环评报告表 编制单位	武汉中环明创生态科技有 限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	1500 万元	环保投资总概算	60 万元	比例	4%
实际总概算	900 万元	环保投资	36 万元	比例	4%
验收监测依据	1、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第 682 号，2017 年 10 月 1 日）； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4 号，2017 年 11 月 20 日）； 3、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类〉的公告》（生态环境部公告 2018 年第 9 号，2018 年 5 月 15 日）； 4、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688 号）； （5）《麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境影响报告表》（武汉中环明创生态科技有限公司，2025 年 4 月）； （6）《关于〈麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境影响报告表〉的批复》（麻环审[2025]18 号）。				

验收监测评价标准、标号、级别、限值

1、废气

本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织监控限值。油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业单位相关排放限值。

表1 废气排放标准一览表

要素分类	标准名称	适用类别	项目	标准限值
废气	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	表2	颗粒物	周界外浓度最高点 1.0mg/m ³
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）	表2（小型）	油烟	最高允许排放浓度 2.0mg/m ³ ，净化设施最低去除率 60%

2、废水

本项目生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，对水质无具体要求及相关标准；生产废水（湿法加工废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水）经沉淀池处理后回用于生产及洗车，对水质无具体要求及相关标准。

3、噪声

本项目东、北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，南、西侧厂界噪声排放执行4类标准限值。

表2 噪声排放标准一览表

要素分类	标准名称	适用类别	项目	评价对象	标准限值	
					昼间	夜间
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	3类	等效连续声级 L _{Aeq}	东、北侧厂界	65 dB (A)	55 dB (A)
		4类	等效连续声级 L _{Aeq}	南、西侧厂界	70 dB (A)	55 dB (A)

4、固废

本项目一般工业固体废物贮存过程应满足“防扬散、防流失、防渗漏”三防要求，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。危险废物交由有资质单位前，贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定。

表二

工程建设内容：

1、项目概况

麻城市达富石业有限公司于 2017 年 9 月 28 日成立，注册地址为湖北省黄冈市麻城市中部石材产业园 L09 号（南湖辖区），经营范围为：石材及石材工艺制品加工、销售、安装；电解染色板加工、销售；石材产品包装；石材制品开发；石业相关项目投资；石材及矿山机械设备销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

麻城市达富石业有限公司现有工程包括“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”，年产石板材 230 万平方米，现有工程环保手续履行情况见下表。

表 3 现有工程环保手续履行情况一览表

日期	环保手续类型	环保手续履行情况
2018.04.27	环境影响评价	原麻城市环境保护局下达了《关于麻城市达富石业有限公司石材加工项目环境影响报告表的批复》（麻环审[2018]47 号）
2018.05.31	竣工环境保护验收	麻城市达富石业有限公司进行了“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”自主竣工环境保护验收（分阶段验收），并于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台进行公示
2020.07.15	排污许可	麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证首次申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2020.07.15-2023.07.14
2020.12.08	竣工环境保护验收	麻城市达富石业有限公司进行了“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”自主竣工环境保护验收（整体验收），并于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台进行公示
2023.01.06	突发环境事件应急预案备案	麻城市达富石业有限公司签署发布了突发环境事件应急预案，该预案经黄冈市生态环境局麻城市分局予以备案并取得《麻城市达富石业有限公司突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：421181-2022-110-L）
2023.07.17	排污许可	麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证延续申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2023.07.15-2028.07.14
2024.07.11	排污许可	麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证重新申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2024.07.11-2029.07.10

现有工程环评批复如下：该项目位于中部麻城产业园 L09 号，总占地面积 66733 平方米。主要建设厂房、办公用房、职工宿舍等配套设施，购置大切机、红外线机等生产设备。本项目以矿山开采的花岗岩石料为原料，进行石材的切割、打磨、染色、年产石板材 260 万平方米（染色板材 30 万平方米），项目总投资 15000 万元，其中环保投资 120 万元。

应市场需求，现有工程从未进行染色板生产，故未建设生产染色板相关构筑物、设备及设施，无染色板产品产能；现有工程于建设过程中将用地面积由原来的 66733m² 扩增至 90200m²（135.3 亩）；并已按照年产石板材（白板）230 万 m² 进行了现有工程竣工环境保护验收（整体验收），未来也不进行染色板生产。

麻城市达富石业有限公司现随着市场需求的扩大，投资 1500 万元建设“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”，新增大切机 12 台及其他加工设备，配套环保设施，年增产石

板材 50 万平方米。即本项目建成后全厂年产石板材 280 万平方米。

2025 年 4 月 23 日，该项目环境影响报告表通过黄冈市生态环境局麻城市分局审批（麻环审[2025]18 号）；2025 年 7 月 7 日，麻城市达富石业有限公司申请取得排污许可证（排污许可证号：91421181MA491GBJ7P001Q），包含本项目分阶段验收建设内容，有效期至 2030 年 7 月 6 日。

“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”于 2025 年 5 月开工建设，现已完成项目主体建设并安装部分生产设备，形成年增产石板材 30 万平方米的生产能力。

目前，项目处于正常运行中，满足验收条件。

2、验收范围及内容

本次验收范围为“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”中“年增产石板材 30 万平方米”的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目建设情况见下表。

表 4 项目建设情况一览表

工程类别	工程名称	现有工程建设内容	本项目建设内容		变动情况
			环评阶段	验收阶段	
主体工程	1#加工车间	1 栋 1F，钢结构，占地面积 5673m ² ； 内设 14 台中切机、5 台磨边机、5 台磨光机、5 台手动磨光机、2 台仿形机、10 台板底机、1 台荔枝机	依托现有 1#加工车间； 新增 11 台中切机、1 台磨边机、5 台板底机	依托现有 1#加工车间； 新增 20 台中切机、5 台板底机、1 台仿形机、4 台倒边机，减少 5 台磨边机、2 台磨光机、5 台手动磨光机	设备稍有变动；其他不变
	2#加工车间	1 栋 1F，钢结构，占地面积 5300m ² ； 内设 2 台自动切边机、5 台手动切边机、2 台喷砂机、3 台火烧机	依托现有 2#加工车间； 新增 1 台喷砂机、3 台火烧机	依托现有 2#加工车间； 新增 1 台火烧机，减少 2 台自动切边机、2 台手动切边机	设备稍有变动；其他不变
	3#加工车间	1 栋 1F，钢结构，占地面积 4320m ² ； 内设红外线切机 29 台	依托现有 3#加工车间； 新增 5 台红外线切机	依托现有 3#加工车间； 新增 5 台红外线切机	无变动
	1#大切车间	1 栋 1F，钢结构，占地面积 5880m ² ； 内设大切机 20 台、龙门切 3 台	/	/	无变动
	2#大切车间	1 栋 1F，钢结构，占地面积 5600m ² ； 内设大切机 24 台	/	设置 14 台大切机，另外 10 台移动至 3#大切车间	设备稍有变动；其他不变
	3#大切车间	/	填平现有应急池，于该地块上新建 3#大切车间； 1 栋 1F，钢结构，占地面积 1932m ² ； 新增 12 台大切机	填平现有应急池，于该地块上新建 3#大切车间； 1 栋 1F，钢结构，占地面积 1932m ² ； 设置 10 台原位于 2#大切车间内的大切机	设备稍有变动；其他不变

辅助工程	办公楼	1 栋 6F, 框架结构, 占地面积 670m ² , 总建筑面积 4112m ² , 内设办公区、食堂区、住宿区	/	/	无变动
	1# 门卫室	1 栋 1F, 混合结构, 占地面积 26m ²	/	/	无变动
	2# 门卫室	1 栋 1F, 混合结构, 占地面积 58m ²	/	/	无变动
	配电室	1 栋 2F, 混合结构, 占地面积 109m ² , 总建筑面积 241m ²	/	/	无变动
储运工程	荒料堆场	露天堆场, 占地面积 12000m ² , 用于荒料暂存	/	/	无变动
	成品堆场	露天堆场, 占地面积 7000m ² , 用于成品暂存	/	/	无变动
	柴油储罐	地埋式储罐 (容量 10m ³) 最大储量 6.4t, 设置配套加油装置及围堰 (h=1.5m)	/	/	无变动
	化学品库	位于 2#加工车间内, 占地面积 40m ² , 用于乙炔、氧气、润滑油、混凝土剂等化学品的分区分类储存	依托现有化学品库, 按照《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) 相关要求对其进行整改	依托现有化学品库, 按照《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) 相关要求对其进行整改	无变动
公用工程	供电系统	由市政供电系统供应	/	/	无变动
	供水系统	由市政供水系统供应	/	/	无变动
	排水系统	建设雨污分流管网, 初期雨水经雨水池处理后用于生产; 生产废水沉淀池处理后回用于生产; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池处理后用于农田施肥	/	/	无变动
	取暖供冷设施	采用单个空调取暖供冷	/	/	无变动
环保工程	废气	湿法加工粉尘: 采用湿法加工、喷雾降尘、加强通风等污染防治措施后无组织排放	湿法加工粉尘: 采用湿法加工、喷雾降尘、加强通风等污染防治措施后无组织排放	湿法加工粉尘: 采用湿法加工、喷雾降尘、加强通风等污染防治措施后无组织排放	无变动
		喷砂粉尘: 经密闭式喷砂机自带滤芯除尘系统处理后无组织排放, 同时采用加强通风等污染防治措施	喷砂粉尘: 经密闭式喷砂机自带滤芯除尘系统处理后无组织排放, 同时采用加强通风等污染防治措施	喷砂粉尘: 经密闭式喷砂机自带滤芯除尘系统处理后无组织排放, 同时采用加强通风等污染防治措施	无变动
		堆场粉尘: 经合理布局堆场、地面硬化、及时清理地面粉尘、设置围挡、洒水降	堆场粉尘: 无新增堆场面积, 依托现有污染防治措施	堆场粉尘: 无新增堆场面积, 依托现有污染防治措施	无变动

		尘等污染防治措施后无组织排放					
		运输粉尘：经地面硬化、设置车辆冲洗、洒水降尘等污染防治措施后无组织排放		运输粉尘：经地面硬化、设置车辆冲洗、洒水降尘等污染防治措施后无组织排放	运输粉尘：经地面硬化、设置车辆冲洗、洒水降尘等污染防治措施后无组织排放	无变动	
		食堂油烟：经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放		堆场粉尘：无新增用餐人数及食堂油烟，依托现有污染防治措施	堆场粉尘：无新增用餐人数及食堂油烟，依托现有污染防治措施	无变动	
	废水	生活污水：食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池处理后用于农田施肥，隔油池容积 5m ³ ，化粪池容积 50m ³		生活污水：新增生活污水依托现有污染防治措施	生活污水：新增生活污水依托现有污染防治措施	无变动	
		生产废水（湿法加工废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水）：设置 2 套沉淀池，总容积合计 8732m ³ （1#沉淀池容积 1820m ³ ，规格 35m*8m*6.5m；2#沉淀池容积 6552m ³ ，规格 84m*12m*6.5m）		生产废水：新增生产废水依托现有污染防治措施（依托现有 1#、2#沉淀池）	生产废水：新增生产废水依托现有污染防治措施（依托现有 1#、2#沉淀池）	无变动	
		初期雨水：设置 1 套雨水池，总容积合计 9360m ³ （雨水池容积 9360m ³ ，规格 36m*26m*10m）		初期雨水：无新增雨水汇水面积，无新增初期雨水，依托现有污染防治措施	初期雨水：无新增雨水汇水面积，无新增初期雨水，依托现有污染防治措施	无变动	
	噪声	合理布置生产设备、选用低噪声生产设备、厂房封闭隔音、距离衰减及绿化隔音		合理布置生产设备、选用低噪声生产设备、厂房封闭隔音、距离衰减及绿化隔音	合理布置生产设备、选用低噪声生产设备、厂房封闭隔音、距离衰减及绿化隔音	无变动	
	固废	生活垃圾：经分散垃圾桶收集，交由环卫部门清运处理		生活垃圾：新增生活垃圾依托现有污染防治措施	生活垃圾：新增生活垃圾依托现有污染防治措施	无变动	
		厨余垃圾、食堂废油脂：经专用容器收集，交由具有特许经营许可的单位收运		厨余垃圾、食堂废油脂：无新增用餐人数及厨余垃圾、食堂废油脂，依托现有污染防治措施	厨余垃圾、食堂废油脂：无新增用餐人数及厨余垃圾、食堂废油脂，依托现有污染防治措施	无变动	
		一般工业固体废物：石泥及沉渣等储存于尾渣堆场；废料、废锯片等储存于废料堆场；根据类别分别交由建材公司或相关物资回收部门回收； （尾渣堆场：位于 2#大切车间东侧，占地面积 800m ² ；废料堆场：位于尾渣堆场东侧，占地面积 800m ² ；按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求设计建设，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求）		一般工业固体废物；新增一般工业固体废物依托现有污染防治措施	一般工业固体废物；新增一般工业固体废物依托现有污染防治措施	无变动	
		危险废物：废润滑油、废油桶、含油抹布与手套储存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 （危废暂存间：位于雨水池南侧，占地面积 10m ² ；未进行规范化建设）		危险废物：新增危险废物依托现有污染防治措施；依托现有危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB15897-2023）相关要求对其进行整改	危险废物：新增危险废物依托现有污染防治措施；依托现有危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB15897-2023）相关要求对其进行整改	无变动	
		设置 1 套应急池，位于 1#大切车间西南侧，容积 2184m ³ （规格 28m*12m*6.5m）		填平现有应急池，新建 1 套应急池，位于 2#沉淀池东侧，容积 2730m ³ （规格 42m*10m*6.5m）	填平现有应急池，新建 1 套应急池，位于 2#沉淀池东侧，容积 2730m ³ （规格 42m*10m*6.5m）	无变动	

3、产品方案

本次验收阶段具体产品方案见下表。

表 5 项目产品方案一览表

序号	产品	环评阶段产能（万 m ² /a）			验收阶段产能（万 m ² /a）			变动情况
		现有工程	本项目	本项目建成后全厂	现有工程	本项目	本项目建成后全厂	

1	磨光板	170	25	195	170	10	180	-15 万 m ² /a，其中 10 万 m ² /a 产能替换为火烧板产能，剩余 5 万 m ² /a 产能纳入后期验收范围
2	喷砂板	30	15	45	30	/	30	-15 万 m ² /a，纳入后期验收范围
3	荔枝板	20	/	20	20	/	20	无变动
4	火烧板	10	10	20	10	20	30	+10 万 m ² /a，由磨光板产能替换
合计	石板材	230	50	280	230	30	260	-20 万 m ² /a，纳入后期验收范围

4、周边环境概况

本项目位于湖北省黄冈市麻城市中部石材产业园 L09 号（南湖辖区）。东侧紧邻陵园及湖北惠荣石业有限公司（三区）；东南侧 210m 为凌家湾；南侧紧邻厦门路，隔道路侧为湖北磊雅鑫盛石业有限公司及湖北麻城鑫蓝翔石业有限公司；西南侧 30m 为湖北省麻城市众磊石业有限公司；西侧紧邻华建路，隔道路侧为湖北金同盛石业有限公司；西北侧 30m 为湖北麻城华正工艺石业有限公司；北侧紧邻空地（规划为批发市场用地及旅馆用地），隔空地为石材文化公园。

表 6 周边环境一览表

序号	名称	方位	与项目红线最近距离（m）	备注
1	湖北惠荣石业有限公司（三区）	东	紧邻	企业
2	凌家湾	东南	210	居民
3	厦门路	南	紧邻	城市主干道
4	湖北磊雅鑫盛石业有限公司	南	30	企业
5	湖北麻城鑫蓝翔石业有限公司	南	30	企业
6	湖北省麻城市众磊石业有限公司	西南	30	居民
7	华建路	西	紧邻	城市主干道
8	湖北金同盛石业有限公司	西	30	企业
9	湖北麻城华正工艺石业有限公司	西北	30	企业

项目评价范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感区域，与环评阶段相比环境敏感目标无变化。

5、主要设备

主要设备验收阶段与环评阶段稍有差别，未建设设备纳入后期验收范围。

表 7 项目主要设备一览表

序号	设备名称	环评阶段设备数量（台/套）			验收阶段设备数量（台/套）			变动情况
		现有工程	本项目	本项目建成后全厂	现有工程	本项目	扩建后全厂	
1	大切机	44	12	56	44	0	44	减少 12 台
2	龙门切	3	0	3	3	0	3	无变动
3	中切机	14	11	25	14	20	34	增加 9 台
4	红外线切机	29	5	34	29	5	34	无变动
5	自动切边机	2	0	2	2	-2	0	减少 2 台
6	手动切边机	5	0	5	5	-2	3	减少 2 台

7	磨边机	5	1	6	5	-5	0	减少 6 台
8	磨光机	5	0	5	5	-2	3	减少 2 台
9	手动磨光机	5	0	5	5	-5	0	减少 5 台
10	仿形机	2	0	2	2	1	3	增加 1 台
11	板底机	10	5	15	10	5	15	无变动
12	喷砂机	2	1	3	2	0	2	减少 1 台
13	荔枝机	1	0	1	1	0	1	无变动
14	火烧机	3	3	6	3	1	4	减少 2 台
15	倒边机	0	0	0	0	5	5	增加 5 台
16	砂石分离机	6	0	6	6	0	6	无变动
17	压榨机	6	1	7	6	1	7	无变动
18	雾炮	2	0	2	2	3	5	增加 3 台
19	洒水车	2	0	2	2	1	3	增加 1 台
20	叉车	42	0	42	42	5	47	增加 5 台
合计		188	39	227	188	31	219	减少 8 台

6、劳动定员及其他

验收阶段劳动定员 200 人，每天 2 班，每班 8 小时，年工作 300 天。

项目设有食堂和职工宿舍，80 人在厂区住宿，80 人在厂区用餐，食堂设有 1 个基准灶头，一日提供 3 餐。

本项目验收阶段劳动定员与环评阶段一致。

7、项目变动情况

目前，项目已建成，仅安装部分生产设备，形成年增产石板材 30 万平方米的生产能力；剩余生产设备及产能均纳入后期验收范围；其他不变；整体项目的性质未发生变化。

项目重大变动界定参照《建设项目竣工环境保护验收暂行方法》和《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），项目实际建设过程中变化情况、变化原因及是否属于重大变动界定情况见下表。

表 8 项目实际建设过程中变化情况、变化原因及是否属于重大变动界定情况一览表

类别	重大变动清单界定内容	变动情况	是否属于重大变动
性质	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。	与环评阶段一致。	否
规模	2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。	分阶段验收，实际年增产石板材 30 万平方米，剩余产能纳入后期验收范围。	否
	3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。	分阶段验收，实际年增产石板材 30 万平方米，剩余产能纳入后期验收范围。	否
	1.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%以上的。	分阶段验收，实际年增产石板材 30 万平方米，剩余产能纳入后期验收范围。	否
地点	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	与环评阶段一致。	否

生产工艺	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加 10%及以上的	实际生产产品、生产工艺与环评阶段一致；实际主要原辅材料、生产设备与环评阶段一致；减少的生产设备以及主要原辅材料用量均纳入后期验收范围。	否
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。	与环评阶段一致。	否
环境保护措施	8.废气、废水污染防治措施变化导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。	与环评阶段一致。	否
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。	与环评阶段一致。	否
	10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。	与环评阶段一致。	否
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的	与环评阶段一致。	否
	12.固体废物利用处置方式由委外利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的	与环评阶段一致。	否
	13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	与环评阶段一致。	否

原辅材料消耗及水平衡：

1、原辅材料消耗

表 9 原辅材料消耗情况一览表

类别	名称	年消耗量		变动情况
		环评阶段	验收阶段	
原料	花岗岩	39.2 万 t/a	36.4 万 t/a	-2.8 万 t/a，纳入后期验收范围
辅料	锯片	15t/a	13.8t/a	-1.2t/a，纳入后期验收范围
	钢砂	9t/a	7.8t/a	-1.2t/a，纳入后期验收范围
	润滑油	4t/a	3.6t/a	-0.4t/a，纳入后期验收范围
	混凝土	2t/a	1.84t/a	-0.16t/a，纳入后期验收范围
	氧气	1.6t/a	2.4t/a	+0.8t/a
	乙炔	0.8t/a	1.2t/a	+0.4t/a
能源	电	150 万 kW*h	142 万 kW*h	-8 万 kW*h，纳入后期验收范围
	水	1044715.1m ³ /a	138060.4m ³ /a	-129960m ³ /a，纳入后期验收范围
	柴油	7.5t/a	6.9t/a	-0.6t/a，纳入后期验收范围

2、水平衡

湿法加工废水、地面冲洗废水经沉淀池混凝沉淀后回用于生产，车辆冲洗废水经洗车槽收集并沉淀后回用于洗车，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，抑尘用水全部蒸发损耗。全厂生产废水、生活污水均不外排。

表 10 验收阶段全年给排水情况一览表（单位：m³/a）

用水排水环节		总用量	投入量			产出量		
			雨水	自来水	回用水	损耗	生活污水	回用水
生活	食堂	1440	0	1440	0	216	1224	0
	住宿	3600	0	3600	0	540	3060	0
	办公	3000	0	3000	0	450	2550	0
湿法加工		4280400	24810	831270	3424320	856080	0	3424320
地面冲洗		2870.5	0	574.1	2296.4	574.1	0	2296.4
车辆冲洗		3640	0	728	2912	728	0	2912
抑	车间	17223	0	17223	0	17223	0	0

尘	道路堆场	7004	0	7004	0	7004	0	0
合计		4319177.5	24810	864839.1	3429528.4	882815.1	6834	3429528.4
			4319177.5			4319177.5		

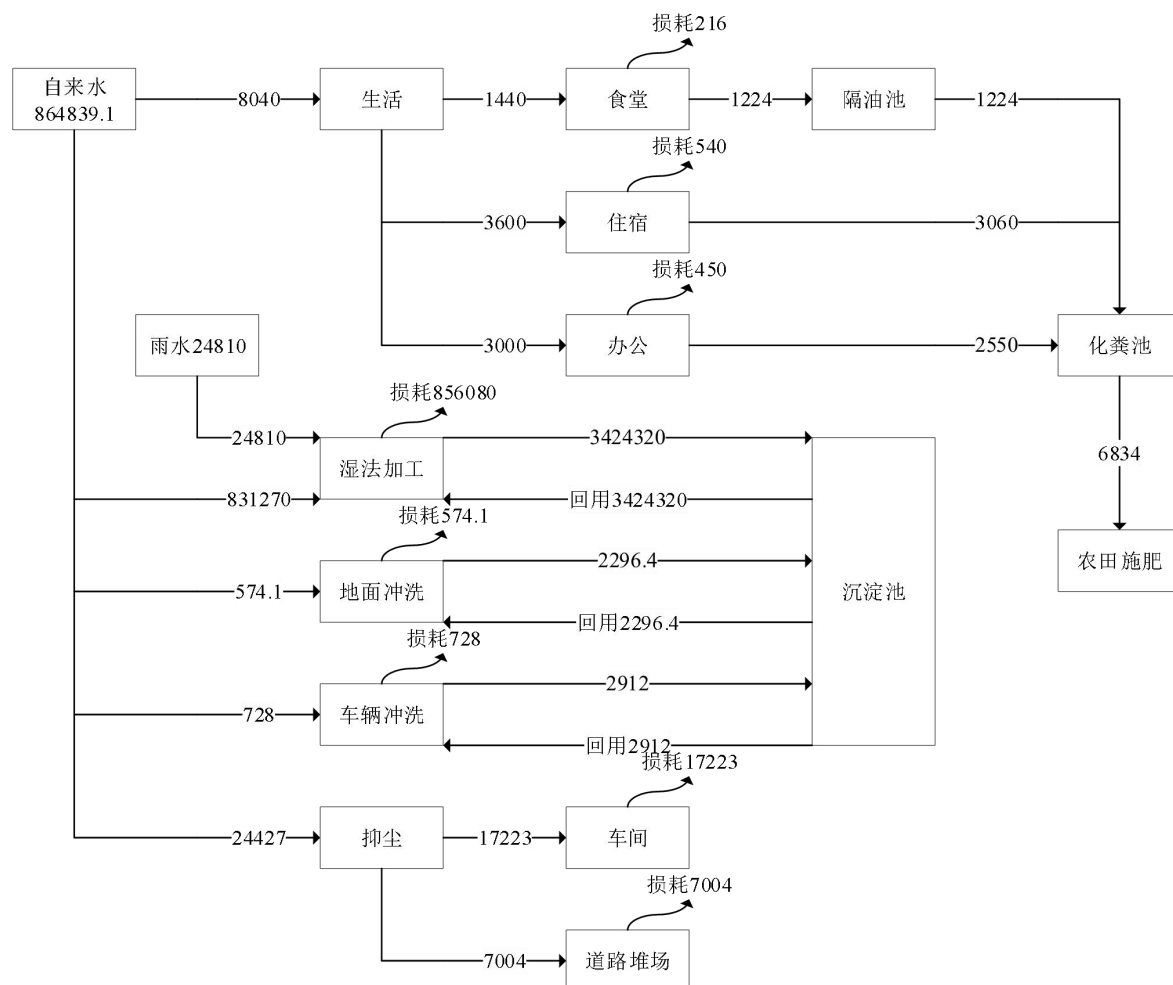


图 1 项目水平衡图 (单位: m^3/a)

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）：

1、运营期工艺流程及产污节点

本项目运营期工艺流程及产污节点图如下。




图 2 磨光板工艺流程和产排污环节图




图 3 喷砂板工艺流程和产排污环节图




图 4 火烧板工艺流程和产排污环节图

2、工艺流程简述

工艺流程简述：

(1) 厂内转运

根据订单要求选择合适规格尺寸的花岗岩荒料，用叉车搬运至加工处。此工序产生的主要污染物为噪声、粉尘。

(2) 切割

将花岗岩荒料根据订单要求采用大切机、中切机等设备进行切割，将不同规格的荒料锯割成一定厚度的具有块状、条状和异形状等不同规格形状的半成品板材。此工序为湿法加工，产生的主要污染物为噪声、粉尘、废料、废水。

(3) 切边

用中切机、小切机等将锯好的半成品板材进一步加工，使其厚度、平整度、光泽度达到要求。此工序为湿法加工，产生的主要污染物为噪声、粉尘、废料、废水。

(4) 打磨

锯好的绝大部分块状或条状半成品板材首先需进行粗磨校厚，然后逐步经过半细磨或细磨直至其表面形成磨光面。此工序为湿法加工，产生的主要污染物为噪声、粉尘、废水。

(5) 喷砂

利用喷砂机，将钢砂高速喷射到需处理半成品板材表面，使板材外表面的外表发生变化。利用压缩空气在高压罐内高速流动形成高压作用，将高压罐内的砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。喷砂机配备有废钢砂自动分离系统及滤芯除尘系统，可用钢砂在喷砂机内循环使用，废钢砂经自动分离系统筛分后进入废钢砂收集料斗，粉尘经滤芯除尘系统处理后进入除尘箱。此工序为干法加工，产生的主要污染物为噪声、粉尘、废钢砂。

(6) 火燃加工

利用组成花岗石的不同矿物颗粒热胀系数的差异，用火焰喷烧使其表面部分颗粒热胀破裂脱落，形成起伏有序的粗面纹饰。本工序采用机器火烧，以乙炔作火焰燃料，利用耐热火

焰喷头对锯割合格的半成品板材表面进行火烧处理。此工序为干法加工，产生的主要污染物为噪声、粉尘。

（7）检验入库：对经完整工序加工的板材进行人工检验其外观及尺寸是否合格，合格品存入成品堆场，不合格品返回加工，直到符合订单要求。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）：

1、主要污染源及产排污情况

本项目运营期污染物产生情况一览表见下表。

表 11 本项目运营期主要产污节点、污染物及其防治措施一览表

类别	产污节点		污染物名称	主要污染物	污染防治措施及去向
废气	湿法加工		湿法加工粉尘	颗粒物	湿法加工，喷雾降尘
	喷砂		喷砂粉尘	颗粒物	密闭式喷砂机自带滤芯除尘系统，加强通风
	火燃加工		火燃废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	加强通风
	运输		运输粉尘	颗粒物	厂区内地面硬化、定期清扫、洒水降尘
	食堂		食堂油烟	油烟	经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放
废水	生活	食堂	食堂废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油	经隔油池及化粪池处理后用于农田施肥
		住宿、办公	住宿废水、办公废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总氮、总磷	经化粪池处理后用于农田施肥
	生产	湿法加工	湿法加工废水	SS	经沉淀池处理后回用于生产
		地面冲洗	地面冲洗废水	SS	
		车辆冲洗	车辆冲洗废水	SS	
噪声	生产		设备噪声	连续等效 A 声级	选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声等降噪措施
固废	生活垃圾	食堂	厨余垃圾、食堂废油脂	厨余垃圾、食堂废油脂	经收集后交由具有特许经营许可的单位收运
		办公、住宿	生活垃圾	生活垃圾	经垃圾桶收集，交由环卫部门清运处理
	一般固体废物	湿法加工	废料	花岗岩	贮存于废料堆场，定期交由相关物资回收部门处置
		湿法加工	废锯片	锯片	
		雨水池、沉淀池清掏	石泥	花岗岩	贮存于尾渣堆场，定期交由相关物资回收部门处置
	危险废物	设备维修保养	废润滑油	废润滑油	贮存于危废暂存间，定期交由相应资质单位处置
		设备维修保养	废油桶	废油桶	
		设备维修保养	含油抹布及手套	含油抹布及手套	

2、污染物处理流程

（1）废气

本项目运营期废气主要为湿法加工粉尘，喷砂粉尘，运输扬尘，堆场扬尘。

A.湿法加工粉尘：采用封闭厂房、湿法作业、喷淋降尘装置等措施后无组织排放。

B.喷砂粉尘：采用自带滤芯除尘系统+加强通风等措施后无组织排放。

C.运输扬尘：采用厂区内地面硬化、定期清扫、洒水降尘等措施后无组织排放。

D.堆场扬尘：采用合理布局堆料场、地面硬化、及时清理地面粉尘、建筑围挡、洒水降尘等措施后无组织排放。



图 5 项目废气防治措施现场照片

(2) 废水

本项目湿法加工废水、地面冲洗废水经沉淀池混凝沉淀后回用于生产，车辆冲洗废水经洗车槽处理后回用于洗车，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，抑尘用水全部蒸发损耗。全厂生产废水、生活污水均不外排。



项目废水防治措施现场照片

(3) 噪声

本项目运营期噪声源主要为大切机、中切机、红外线切机等生产设备。采用低噪声设备，采取基础减震、墙体隔声等措施，减少噪声对外环境的影响。

(4) 固废

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。

A.生活垃圾：经垃圾桶分类收集后，依托园区生活垃圾集中收集点以及转运系统，后由

园区交由环卫部门定期清运处理；

B.一般工业固体废物：如尾渣、废料、废锯片等，暂存于一般固废暂存间，定期交由相关物资回收部门处置；废滤材直接交由厂家处置，不予厂内贮存；

C.危险废物：如废润滑油、废油桶、含油抹布及手套等，暂存于危废暂存间，定期交由相关有资质单位处置。



图 6 项目固废贮存设施现场照片

3、其他

(1) 卫生防护距离执行情况

本项目环评要求整个厂区设置 80m 的防护距离，验收阶段该防护距离范围内无居民等敏感点存在，满足卫生防护距离管控要求。

(2) 环境管理制度落实情况

A.执行国家建设项目环境管理制度情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等相关要求，麻城市达富石业有限公司对其“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”实施了环境影响评价制度；在项目实施过程中，执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。项目各项环评审批手续及“三同时”执行情况如下：

- ①《麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境影响报告表》（武汉中环明创生态科技有限公司，2025 年 4 月）；
- ②《关于麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境影响报告表的批复》（麻环审

[2025]18号，2025年4月23日）。

B.环境管理机构设置及有关环境管理制度的执行情况

企业制定了较为完善的环境保护管理规章制度，配备了专门的环境管理人员协调公司与环保部门的工作，并按照环境保护管理规章制度对公司进行环境管理。

C.环境事故及公众投诉的情况

通过咨询环保主管部门及对周边环境敏感点的走访调查，项目在建设期间及试运行期间未发生过环境污染事故，也未收到过周边环境敏感点的投诉等情况。

D.排污许可证申请执行情况

2025年7月7日，麻城市达富石业有限公司申请取得排污许可证（排污许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期至2030年7月6日。

E.应急预案执行情况

2023年1月6日，麻城市达富石业有限公司签署发布了突发环境事件应急预案；2023年1月6日，该预案经黄冈市生态环境局麻城市分局予以备案并取得《麻城市达富石业有限公司突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：421181-2022-110-L）。

（3）环境风险防范及应急措施落实情况

为了避免各种环境事故的发生，降低项目存在的环境风险值，建设单位采取了相应的风险防范措施，使项目环境风险降到最低水平，具体风险防范和应急措施如下。

A.对危险品的运输、贮存、使用，按照《危险化学品安全管理条例》的要求建立健全安全的规章制度，以保证不流失于环境，造成对环境的污染。

B.项目化学品库保证通风、远离火源、热源，消防设施齐备。原材料进出应有严格的登记保管制度，使用应遵照相应的安全操作规范进行，不可随意废弃。

C.针对危险化学品的泄漏事故，建设单位建立健全的管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查，每天都应对原辅料存放点进行检查：化学品库地面进行防处理，设置必要的围堰设施，避免发生泄漏时液体物料外流出场外，泄漏事故的影响是可控的。

D.定期进行人员安全培训，危险化学品使用过程中严格按照有关标准章程进行操作，并配置应急冲洗设备，应当设在可能发生急性损伤的工作场所或者临近地点，并在醒目位置设置清晰的标识。若不慎沾染危险化学品，应用大量清水冲洗，并及时就医，保障员工安全。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、建设项目“三同时”验收一览表

表 12 项目“三同时”验收一览表

类别	治理项目	环保治理措施	处理效果及目标
废气	湿法加工粉尘	湿法加工，喷雾降尘	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	喷砂粉尘	密闭式喷砂机自带滤芯除尘系统，加强通风	
	火燃废气	加强通风	
	运输粉尘	厂区内地面硬化、定期清扫、洒水降尘	
	食堂油烟	经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
废水	食堂废水	经隔油池及化粪池处理后用于农田施肥	用于农田施肥，不外排
	住宿废水、办公废水	经化粪池处理后用于农田施肥	用于农田施肥，不外排
	湿法加工废水	经沉淀池处理后回用于生产	满足生产回用要求后循环使用，不外排
	地面冲洗废水		
	车辆冲洗废水		
噪声	设备噪声	选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声等降噪措施	东、北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值，南、西侧厂界噪声排放执行 4 类标准限值
固废	厨余垃圾、食堂废油脂	经收集后交由具有特许经营许可的单位收运	零排放
	生活垃圾	经垃圾桶收集，交由环卫部门清运处理	
	废料	贮存于废料堆场，定期交由相关物资回收部门处置	
	废锯片		
	石泥	贮存于尾渣堆场，定期交由相关物资回收部门处置	
	废润滑油	贮存于危废暂存间，定期交由相应资质单位处置	
	废油桶		
	含油抹布及手套		
土壤及地下水污染防治措施	项目区域内		分区防渗

2、建设项目环境影响报告表主要结论

(1) 废气

本项目运营期废气主要为湿法加工粉尘，喷砂粉尘，运输扬尘，堆场扬尘。

A.湿法加工粉尘：采用封闭厂房、湿法作业、喷淋降尘装置等措施后无组织排放。

B.喷砂粉尘：采用自带滤芯除尘系统+加强通风等措施后无组织排放。

C.运输扬尘：采用厂区内地面硬化、定期清扫、洒水降尘等措施后无组织排放。

D.堆场扬尘：采用合理布局堆料场、地面硬化、及时清理地面粉尘、建筑围挡、洒水降尘等措施后无组织排放。

本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（2）废水

本项目生产废水经沉淀池混凝沉淀后回用于生产，不外排，生产回用水对水质无具体要求，且无相关标准或规范；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。

（3）噪声

本项目运营期噪声源主要为大切机、中切机、红外线切机等生产设备。采用低噪声设备、基础减震、墙体隔声、厂区绿化、车辆环境管理等措施。

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及4类标准限值。

（4）固体废物

A.生活垃圾：经垃圾桶分类收集后，依托园区生活垃圾集中收集点以及转运系统，后由园区交由环卫部门定期清运处理；

B.一般工业固体废物：如尾渣、废料、废锯片等，暂存于一般固废暂存场所，定期交由相关物资回收部门处置；如污泥等，经专用容器收集，交由环卫部门清运处理；

C.危险废物：如废润滑油、废油桶、含油抹布及手套等，暂存于危废暂存间，定期交由相关有资质单位处置。

上述废物去向可行，分类存放、妥善保管。建设方对固废统一收集、安全存放，不会对环境造成二次污染。

（5）总量控制指标

根据《麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境影响报告表》（报批稿）及其批复，本项目仅排放无组织颗粒物，无总量控制指标。

3、审批部门审批决定

黄冈市生态环境局麻城市分局于2025年4月23日下达《关于麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境影响报告表的批复》（麻环审[2025]18号），批复如下：

一、该项目位于湖北省麻城市中部石材产业园L09号，为满足市场需求，拟在现有厂区

范围内进行扩建。主要工程内容为增建生产车间 1 栋（3 大切车间），增加 12 台大切机、11 台中切机等生产设备。扩建完成后，年增产石板材 50 万平方米，全厂总产能为年产石板材 280 万平方米。扩建项目总投资 1500 万元，其中新增环保投资 60 万元。该项目符合国家产业政策，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，项目实施对环境的不利影响可得到减缓和控制，《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目实施必须严格落实《报告表》中提出的各项污染防治及“以新带老”措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实废水污染防治措施。厂区应实行雨污分流，建设规范的收集系统对厂区初期雨水进行收集，雨水经沉淀处理后用于生产补水，不外排；配套建设生产废水处理设施和循环利用系统，废水经处理后回用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用于周边农田肥田。

（二）严格落实废气污染防治措施。项目生产过程中采取中水回用切割、湿法作业、车间定时洒水降尘等措施，厂区道路应硬化处理，定时清扫并采取洒水降尘措施，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值要求。

（三）严格落实固废处置措施。按“减量化、资源化、无害化”原则，制定并落实固体废弃物综合利用处置方案，石粉、边角废料应综合利用，禁止随意堆积和外排；废润滑油、废油桶等危险废物应严格管控建设规范的危废暂存间暂存，委托有处理资质的单位定期进行安全处置。固体废物在厂内暂存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求，防止产生二次污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布局，选用低噪声设备并合理布置，定期进行设备维护保养，对产噪设备采取减振、隔声措施，加强厂区绿化，确保厂界噪声达标。

（五）落实各项风险防控措施，有效防范环境风险。应建立严格的环境保护与安全管理 制度，制定突发环境事件应急预案并报我局备案，定期开展环境风险应急防范预案演练，严格操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。

三、项目建设必须严格执行环保“三同时”和排污许可制度，落实各项环保措施。项目建成后，应按规定办理排污许可证，按证排污并落实证后管理相关要求；自行开展竣工环境

保护验收工作，并依法公开验收信息，手续齐全合格后方可投入生产。

四、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目环评信息，接受公众和社会监督。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺、污染、防治措施等发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。项目自批准之日起超过 5 年方开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

六、请麻城市生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理，你公司应按规定主动接受各级生态环境主管部门的监督检查。

4、环评批复意见及落实情况

表 13 项目环评及批复落实情况一览表

序号	环评批复	落实情况	落实情况
1	严格落实废水污染防治措施。厂区应实行雨污分流，建设规范的收集系统对厂区初期雨水进行收集，雨水经沉淀处理后用于生产补水，不外排；配套建设生产废水处理设施和循环利用系统，废水经处理后回用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用于周边农田肥田。	严格落实废水污染防治措施。厂区应实行雨污分流，建设规范的收集系统对厂区初期雨水进行收集，雨水经沉淀处理后用于生产补水，不外排；配套建设生产废水处理设施和循环利用系统，废水经处理后回用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用于周边农田肥田。	已落实
2	严格落实废气污染防治措施。项目生产过程中采取中水回用切割、湿法作业、车间定时洒水降尘等措施，厂区道路应硬化处理，定时清扫并采取洒水降尘措施，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中排放限值要求。	严格落实废气污染防治措施。项目生产过程中采取中水回用切割、湿法作业、车间定时洒水降尘等措施，厂区道路应硬化处理，定时清扫并采取洒水降尘措施，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中排放限值要求。	已落实
3	严格落实固废处置措施。按“减量化、资源化、无害化”原则，制定并落实固体废弃物综合利用处置方案，石粉、边角废料应综合利用，禁止随意堆积和外排；废润滑油、废油桶等危险废物应严格管控建设规范的危废暂存间暂存，委托有处理资质的单位定期进行安全处置。固体废物在厂内暂存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染。	严格落实固废处置措施。按“减量化、资源化、无害化”原则，制定并落实固体废弃物综合利用处置方案，石粉、边角废料应综合利用，禁止随意堆积和外排；废润滑油、废油桶等危险废物应严格管控建设规范的危废暂存间暂存，委托有处理资质的单位定期进行安全处置。固体废物在厂内暂存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染。	已落实
4	严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布局，选用低噪声设备并合理布置，定期进行设备维护保养，对产噪设备采取减振、隔声措施，加强厂区绿化，确保厂界噪声达标。	严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布局，选用低噪声设备并合理布置，定期进行设备维护保养，对产噪设备采取减振、隔声措施，加强厂区绿化，确保厂界噪声达标。	已落实
5	落实各项风险防控措施，有效防范环境风险。应建立严格的环境保护与安全管理制度，制定突发环境事件应急预案并报我局备案，定期开展环境风险应急防范预案演练，严格操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。	落实各项风险防控措施，有效防范环境风险。应建立严格的环境保护与安全管理制度，制定突发环境事件应急预案并报我局备案，定期开展环境风险应急防范预案演练，严格操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。	已落实

表五

验收监测质量保证及质量控制：

1、检测方法

表 14 检测方法、使用仪器、检出限一览表

检测类别	检测项目	检测方法	主要仪器设备	方法检出限
无组织排放废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》 (HJ 1263-2022)	AUW120D 分析天平 (十万分之一) HMJC-YQ-SY-009	167 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	AWA5688 多功能声级计 HMJC-YQ-CY-075 AWA6021A 声校准器 HMJC-YQ-CY-039	/

2、质量控制及保证

- (1) 检测过程按照国家相关标准的技术要求执行；
- (2) 参与本次监测的人员均持有相关监测项目上岗资格证书；
- (3) 所使用仪器、设备均经计量检定/校准，且在有效期内使用；
- (4) 严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测；
- (5) 为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采样、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行；
- (6) 检测数据和报告均实行三级审核。

表 15 检测质量控制结果统计表

声级计校准结果					
检测日期	测量前校准示值 (dB (A))	测量后校准示值 (dB (A))	测量前、后校准示值差值 (dB (A))	差值允许范围 (dB (A))	结果评价
2025.06.22	93.7	93.7	0.0	≤ 0.5	合格
2025.06.23	93.7	93.7	0.0	≤ 0.5	合格
质控结论					
本次检测所选分析方法准确，均在本公司检测能力认证范围内，质量控制结果合格。					

表六

验收监测内容：

表 16 检测内容一览表

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
无组织排放废气	○1#厂界上风向	颗粒物	2 天*4 次/天
	○2#厂界下风向		
	○3#厂界下风向		
	○4#厂界下风向		
噪 声	△N1 厂界东侧外 1m	等效连续 A 声级	2 天*2 次（昼、夜各一次）/天
	△N2 厂界北侧外 1m		
	△N3 厂界西侧外 1m		
	△N4 厂界南侧外 1m		

表七

验收监测期间生产工况记录:

本次验收范围为“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”中“年增产石材 30 万平方米”，年生产天数为 300 天，折合日产花岗岩石板材 1000m²。验收监测期间，生产设备及环保设施均正常运行，具备验收条件。

本项目监测日期为 2025 年 6 月 22 日-2025 年 6 月 23 日，监测期间生产工况见下表。

表 17 监测期间生产工况及生产负荷情况一览表

产品名称	设计产能	2025 年 6 月 22 日		2025 年 6 月 23 日	
		产能	生产负荷	产能	生产负荷
花岗岩石板材	1000m ² /天	900m ² /天	90%	900m ² /天	90%

验收监测结果:

1、监测结果

表 18 无组织排放废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果(mg/m ³)					参考限值 (mg/m ³)
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	最大值	
2025.06.22	○1#厂界上风向	颗粒物	0.257	0.263	0.281	0.252	0.281	1.0
	○2#厂界下风向		0.452	0.433	0.460	0.417	0.460	1.0
	○3#厂界下风向		0.369	0.383	0.346	0.399	0.399	1.0
	○4#厂界下风向		0.485	0.446	0.467	0.523	0.523	1.0
2025.06.23	○1#厂界上风向	颗粒物	0.229	0.265	0.214	0.242	0.265	1.0
	○2#厂界下风向		0.347	0.361	0.340	0.377	0.377	1.0
	○3#厂界下风向		0.351	0.348	0.327	0.369	0.369	1.0
	○4#厂界下风向		0.457	0.413	0.479	0.484	0.484	1.0

表 19 噪声检测监测结果

采样日期	检测点位	主要噪声	测量时段		检测结果 Leq[dB(A)]	参考限值[dB(A)]
2025.06.22	△N1 厂界东侧外 1m	生产噪声	13:20-13:30	昼间	58.8	65
		生产噪声	22:01-22:11	夜间	48.1	55
	△N2 厂界北侧外 1m	交通噪声	13:35-13:55	昼间	65.5	70
		交通噪声	22:16-22:36	夜间	54.1	55
	△N3 厂界西侧外 1m	交通噪声	14:20-14:40	昼间	67.1	70
		交通噪声	22:40-23:00	夜间	51.9	55
	△N4 厂界南侧外 1m	生产噪声	15:35-15:45	昼间	59.2	65
		生产噪声	23:06-23:16	夜间	49.6	55
2025.06.23	△N1 厂界东侧外 1m	生产噪声	13:40-13:50	昼间	60.8	65
		生产噪声	22:58-23:08	夜间	50.6	55
	△N2 厂界北侧外 1m	交通噪声	13:55-14:15	昼间	61.1	70
		交通噪声	23:10-23:30	夜间	53.3	55
	△N3 厂界西侧外 1m	交通噪声	14:19-14:39	昼间	60.6	70
		交通噪声	23:34-23:54	夜间	52.2	55
	△N4 厂界南侧外 1m	生产噪声	14:48-14:58	昼间	60.2	65
		生产噪声	23:58-00:08 次日	夜间	50.1	55

2、污染物排放总量核算

根据环评报告，本项目颗粒物为无组织排放，无法核算，因此不进行总量核算。

表八

验收监测结论:

1、环境管理“三同时”制度执行情况

项目工程在实施过程中,执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度,基本落实了环评报告表及其审批文件中提出的各项污染防治措施,工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行,目前各类环保设施已基本落实到位。

表 20 环境管理“三同时”制度执行情况一览表

类别	治理项目		环评阶段		验收阶段		实际 环保 投资 (万元)	落 实 情 况
			环保治理措施	处理效果及目标	环保治理措施	处理效果及目标		
废气	湿法加工粉尘		湿法加工, 喷雾降尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界无组织监控限值要求	湿法加工, 喷雾降尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界无组织监控限值要求	5	已落实
	运输粉尘		厂区内地面硬化、定期清扫、洒水降尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界无组织监控限值要求	厂区内地面硬化、定期清扫、洒水降尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界无组织监控限值要求	1	已落实
	堆场扬尘		合理布局堆场、地面硬化、及时清理地面粉尘、设置围挡、洒水降尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界无组织监控限值要求	合理布局堆场、地面硬化、及时清理地面粉尘、设置围挡、洒水降尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界无组织监控限值要求	1	已落实
	食堂油烟		经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型饮食业单位相关排放限值	经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型饮食业单位相关排放限值	1	已落实
废水	生活污水		经隔油池及化粪池处理后用于农田施肥	用于农田施肥, 不外排	经隔油池及化粪池处理后用于农田施肥	用于农田施肥, 不外排	6	已落实
	生产废水		经沉淀池处理后回用于生产	回用于生产, 不外排	经沉淀池处理后回用于生产	回用于生产, 不外排	2	已落实
	初期雨水		经雨水池处理后用于生产	用于生产, 不外排	经雨水池处理后用于生产	用于生产, 不外排	1	已落实
噪声	设备噪声		选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声等降噪措施	东、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准, 南、西侧厂界执行4类标准	选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声等降噪措施	东、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准, 南、西侧厂界执行4类标准	3	已落实
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	经分散垃圾桶收集, 交由环卫部门清运处理	零排放	经分散垃圾桶收集, 交由环卫部门清运处理	零排放	1	已落实
	厨余垃圾、食堂	厨余垃圾、食堂	经专用容器收集, 交由	零排放	经专用容器收集, 交由	零排放	1	已落实

		废油脂	具有特许经营许可的单位收运		具有特许经营许可的单位收运			实
	一般工业固体废物	喷砂机除尘箱收集粉尘、石泥及沉渣	暂存于尾渣堆场，定期交由相关物资回收部门处置	零排放	暂存于尾渣堆场，定期交由相关物资回收部门处置	零排放	2	已落实
		废料、废锯片、废钢砂	暂存于废料堆场，定期交由相关物资回收部门处置	零排放	暂存于废料堆场，定期交由相关物资回收部门处置	零排放	2	已落实
	危险废物	废润滑油、含油抹布及手套、废油桶	贮存于危废暂存间，定期交由相应资质单位处置	零排放	贮存于危废暂存间，定期交由相应资质单位处置	零排放	5	已落实
土壤及地下水污染防治措施	项目区域内		分区防渗		分区防渗		5	已落实
合计							36	/

2、污染物达标排放情况

（1）废气

根据验收监测结果可知，本项目颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（2）废水

本项目湿法加工废水、地面冲洗废水经沉淀池混凝沉淀后回用于生产，不外排，生产回用水对水质无具体要求，且无相关标准或规范；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。

（3）噪声

根据验收监测结果可知，运营期项目东、北侧噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，南、西侧厂界噪声排放可满足4类标准限值，不会对周边声环境质量产生明显的不利影响。

（4）固废

A.生活垃圾：经垃圾桶分类收集后，依托园区生活垃圾集中收集点以及转运系统，后由园区交由环卫部门定期清运处理；

B.一般工业固体废物：如尾渣、废料、废锯片等，暂存于一般固废暂存间，定期交由相

关物资回收部门处置；如污泥等，经专用容器收集，交由环卫部门清运处理；

C.危险废物：如废润滑油、废油桶、含油抹布及手套等，暂存于危废暂存间，定期交由相关有资质单位处置。

上述废物去向可行，分类存放、妥善保管。建设方对固废统一收集、安全存放，不会对环境造成二次污染。

3、验收结论

麻城市达富石业有限公司“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”在实施过程中，按照国家建设项目环境保护“三同时”制度，基本落实了环评报告表及其审批文件中提出的污染防治措施，从验收监测单位提供的监测结果来看，项目产生的各类污染物排放满足相关标准要求，本项目符合建设项目竣工环保验收条件。

4、建议

（1）建立环境管理、环保设备运行等管理制度；加强废气处理设施运行管理，保障收集效率及处理效率。

（2）项目应加强对设备的维护保养和规范操作，以维持其正常运转。

（3）进一步建立健全环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其他环境统计资料。

附表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：麻城市达富石业有限公司														填表人（签字）：				项目经办人（签字）：			
建设项目	项目名称		麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目						项目代码		2312-421181-04-03-137697		建设地点		湖北省黄冈市麻城市中部石材产业园 L09 号						
	行业类别（分类管理名录）		二十七、非金属矿物制品业 30-56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303						建设性质		☐ 新建 ☒ 改扩建 ☐ 技术改造										
	设计生产能力		年增产石板材 50 万平方米						实际生产能力		年增产石板材 30 万平方米		环评单位		武汉中环明创生态科技有限公司						
	环评文件审批机关		黄冈市生态环境局麻城市分局						审批文号		麻环审[2025]18 号		环评文件类型		报告表						
	开工日期		2025 年 5 月						竣工日期		2024 年 6 月		排污许可证申领时间		2025 年 7 月 7 日						
	环保设施设计单位		/						环保设施施工单位		/		本工程排污许可证编号		91421181MA491GBJ7P001Q						
	验收单位		麻城市达富石业有限公司						环保设施监测单位		湖北华明检测有限公司		验收监测时工况		90%						
	投资总概算（万元）		1500						环保投资总概算（万元）		60		所占比例（%）		4%						
	实际总投资（万元）		900						实际环保投资（万元）		36		所占比例（%）		4%						
	废水治理（万元）		9	废气治理（万元）		8	噪声治理（万元）		3	固体废物治理（万元）		11		绿化及生态（万元）		5					
	新增废水处理设施能力		--						新增废气处理设施能力		--		年平均工作时		4800h						
运营单位		麻城市达富石业有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				91421181MA491GBJ7P		验收时间		2024 年 7 月							
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）							
	废水																				
	化学需氧量																				
	氨氮																				
	石油类																				
	废气																				
	二氧化硫																				
	烟尘																				
	工业粉尘		2.487					0.358	0.596			2.845	3.083		+0.358						
	氮氧化物																				
	工业固体废物																				
	与项目有关的其他特征污染物																				

注：1、排放削减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——克/升。

黄冈市生态环境局麻城市分局

麻环审〔2025〕18号

关于麻城市达富石业有限公司石材加工 扩建项目环境影响报告表的批复

麻城市达富石业有限公司：

你公司报送的《麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、该项目位于湖北省麻城市中部石材产业园 L09 号，为满足市场需求，拟在现有厂区范围内进行扩建。主要工程内容为增建生产车间 1 栋（3#大切车间），增加 12 台大切机、11 台中切机等生产设备。扩建完成后，年增产石板材 50 万平方米，全厂总产能为年产石板材 280 万平方米。扩建项目总投资 1500 万元，其中新增环保投资 60 万元。该项目符合国家产业政策，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，项目实施对环境的不利影响可得到减缓和控制，《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目实施必须严格落实《报告表》中提出的各项污染防治及“以新带老”措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实废水污染防治措施。厂区应实行雨污分流，建设规范的收集系统对厂区初期雨水进行收集，雨水经沉淀处理后用于生产补水，不外排；配套建设生产废水处理设施和循环利用系统，废水经处理后回用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用于周边农田肥田。

（二）严格落实废气污染防治措施。项目生产过程中采取中水回用切割、湿法作业、车间定时洒水降尘等措施，厂区道路应硬化处理，定时清扫并采取洒水降尘措施，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值要求。

(三) 严格落实固废处置措施。按“减量化、资源化、无害化”原则，制定并落实固体废弃物综合利用处置方案，石粉、边角废料应综合利用，禁止随意堆积和外排；废润滑油、废油桶等危险废物应严格管控，建设规范的危废暂存间暂存，委托有处理资质的单位定期进行安全处置。固体废物在厂内暂存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染。

(四) 严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布局，选用低噪声设备并合理布置，定期进行设备维护保养，对产噪设备采取减振、隔声措施，加强厂区绿化，确保厂界噪声达标。

(五) 落实各项风险防控措施，有效防范环境风险。应建立严格的环境保护与安全管理制度，制定突发环境事件应急预案并报我局备案，定期开展环境风险应急防范预案演练，严格操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。

三、项目建设必须严格执行环保“三同时”和排污许可制度，落实各项环保措施。项目建成后，应按规定办理排污许可证，按证排污并落实证后管理相关要求；自行开展竣工环境保护验收工作，并依法公开验收信息，手续齐全合格后方可投入生产。

四、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目环评信息，接受公众和社会监督。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺、污染防治措施等发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。项目自批准之日起超过5年方开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

六、请麻城市生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理，你公司应按规定主动接受各级生态环境主管部门的监督检查。

黄冈市生态环境局麻城市分局

2025年4月23日



排污许可证

证书编号：91421181MA491GBJ7P001Q

单位名称：麻城市达富石业有限公司

注册地址：麻城市中部石材产业园L09（南湖辖区）

法定代表人：徐仝惠

生产经营场所地址：麻城市中部石材产业园L09（南湖辖区）

行业类别：建筑用石加工

统一社会信用代码：91421181MA491GBJ7P

有效期限：自2025年07月07日至2030年07月06日止



发证机关：（盖章）黄冈市生态环境局麻城

市分局

发证日期：2025年07月07日

中华人民共和国生态环境部监制

黄冈市生态环境局麻城市分局印制

麻城市达富石业有限公司突发环境事件应急预案备案表

单位名称	麻城市达富石业有限公司	机构代码	91421181MA491GBJ7P
法定代表人	杜娟	联系电话	13067202057
联系人	林建艳	联系电话	13328239932
地址	湖北省麻城市中部石材产业园 L09 号（南湖辖区） 经度：115.04681110, 纬度 31.08417927		
预案名称	麻城市达富石业有限公司突发环境事件应急预案		
风险级别	一般[一般-大气（Q0）+ 一般-水（Q0）]		
本单位于 年 月 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 预案制定单位（公章）：麻城市达富石业有限公司			
预案签署人	杜鹃	报送时间	 2023年 1 月 6 日
突发环境事件应急预案备案文件目录	1. 突发环境事件应急预案编制说明一份； 2. 突发环境事件应急预案一份； 3. 突发环境事件风险评估报告一份； 4. 突发环境事件应急资源调查报告一份； 5. 专家评审意见一份； 6. 突发环境事件应急预案备案表一份；		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2023年1月6日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章）		
备案编号	421181-2022-110-L		
报送单位	麻城市达富石业有限公司		
受理部门负责人		经办人	

环境管理制度

	制度名称	麻城市达富石业有限公司		
	制度编号	/	制度文号	/
	制度版本	/	主办部门	综合管理办公室
所属业务类别	健康安全环境管理/环境保护管理/环保监督管理		会签部门	所有部门
解释权归属	综合管理办公室		签发日期	2025 年 7 月 1 日
废止说明	/		生效日期	2025 年 7 月 1 日
制定目的	明确环保管理职责和内容，规范环保管理程序			
制定依据	中华人民共和国环境保护法			
适用范围	麻城市达富石业有限公司			
涉及的相关制度	/	业务类别	健康安全环境管理/环境保护管理/环保监督管理	
		所属层次	实施类	

第一章 目的

第一条 为了保护我单位生活和生产环境，防治污染，保障职工身体健康，确保周边环境不受影响，特制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 适用于麻城市达富石业有限公司内所有生产和生活产生的环境污染防治和治理的管理。

第三章 职责

第三条 单位法人是单位的最高管理者，是环境保护工作的第一责任人，应认真遵守国家环保法律法规和方针、政策，加强环境保护和污染防治工作，把环境保护工作列入重要议事日程，不定期召开会议，解决有关环境保护的重大问题，并对本制度的贯彻落实负领导责任。

第四条 领导实行环境保护“一把手”负责制，对本单位环境保护工作负责，制定环境保护目标，并进行内部考核。组织本单位职工专业技能培训，确保职工按照岗位操作规程进行操作，避免因错误或习惯性操作引发污染事故。

第五条 建立适应企业发展需要的、健全的环境保护管理体系和从事环境保护工作的专业或监管队伍，建立健全环境保护制度。

第六条 综合管理办公室负责具体贯彻实施国家有关环保法律、法规、方针和政策，对环境保护工作实施统一监督管理，对各排污单位进行考核，负责组织对污染事故的调查，并有权力提示新建、改建、扩建项目的“三同时”工作。

第七条 制剂楼在组织生产过程中，必须将保护环境放在重要位置，确保环保设施与生产设施同步运行，并对生产过程中的污染环境事件负责。

第八条 综合管理办公室在组织新、扩、改建项目论证审查时，要将环境保护列入项目主要内容，确保环保“三同时”，并采用先进适用的污染物治理、防护技术。

第九条 基建办公室要将环保设施纳入生产设施的统一管理，确保环保设施正常运行，达到设计要求，并对环保设备的技术状况和正常运行负责。

第十条 基建办公室对院区绿化维护负有兼管责任，将对院区草坪、树木等的管理纳入考核，避免因兼管不善造成的草坪、树木等踩踏、坏死、丢失等现象。

第四章 管 理

第十一条 单位各单位要重视环境保护、节能减排方面知识的宣传教育，提高干部职工的环境保护意识和法制观念。综合管理办公室负责编制环保培训教材，定期对职工进行培训。

第十二条 单位要有计划的培养和引进环保专业人才。各单位在进行职工培训教育时，应把环境保护教育作为一项重要内容，不断提高职工环境保护的意识和环保专业技术水平。

第十三条 安保人员要对环境状况和环境保护工作进行统计调查，并汇总上报领导。

第十四条 任何员工都有保护环境的义务，并有权对污染、破坏环境、毁坏花草、树木的行为向领导或有关部门举报。

第十五条 必须保证环保设施随生产同步运行，环保设施或设备进行检修，须向基建办公室报告，经同意后，方可实施。环保设施必须严格按照操作说明书进行操作。

第十六条 加强节水管理，避免浪费水资源现象。

第十七条 固体废弃物应积极回收利用，禁止乱排乱堆现象，杜绝固体废弃物污染环境事故。

第十八条 院区绿化应以净化和绿化为主，兼顾美化，尽量采用对空气有净化作用的树种，采取乔、灌、草相结合的种植方式，扩大绿化面积。

第十九条 每年委托有资质的监测单位来院进行监测，持续改进，加强对环境质量的监督管理。

第二十条 安全环保人员要经常深入现场，对环保设施运转使用情况及污染现象进行检查、指导，并对职工提出的环境问题予以答复，对于存在的环保问题提出整改意见，限期整改。

第二十一条 设置环保专员，负责本单位的环境保护、节能减排工作，并定期组织培训并进行考核。

第五章 建设项目的环境管理

第二十二条 对于新、扩、改建项目，在建设之前，必须执行环境影响评价制度，对项目建成投产后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评估，提出防治措施。基建办公室在工程筹建过程中对环境影响评价中提出的防治措施的实施情况进行监督。基建办公室在对项目进行论证时必须考虑环境影响评价中提出的防治措施，采用评价中提出的或优于评价中的治理工艺。

第二十三条 严格执行环保“三同时”制度，即新建、改建、扩建的基本建设项目其环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（一）工程设计阶段，建设项目的工艺设计应该积极采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限度的提高资源、能源利用率，从源头减少污染物排放，尽可能在生产过程中把污染减少到最低限度。

（二）建设项目的环境治理工艺设施尽可能采用国家推荐的技术工艺，禁止采用落后的淘汰的技术设备。

（三）工程施工阶段，筹建处安排专人负责，落实施工计划与进度，保证工程质量，基建办公室在工程施工过程中，要对项目“三同时”情况进行监督检查，以确保建设项目的环保设施与主体工程同时施工。

（四）工程竣工后，试生产前，由基建办公室申请，综合管理办公室对设施进行验收，方可进行试生产。建设项目投入试生产之日起3个月内，应组织建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

第二十四条 建设项目的环境治理资金占项目总投资的比例应不低于国家规定。

第二十五条 未经基建办公室、综合管理办公室等有关部门的统一，各单位对现有环保设施不得私自拆除、改动、改造。

第二十六条 对于投入使用的环保设施应按照设计使用说明书定期进行维护，以保证其运行效果。

第二十七条 对于可能产生较大污染的部位、工艺，要查找产生污染的原因，改进工艺操作，加强人员操作，尽量避免污染。

第二十八条 对于新、扩、改建项目的相关资料（包括技术协议等）必须上报基建办公室一份备案。

第六章 大气污染防治管理办法

第二十九条 大气污染防治的监督管理

一、污染物排放需根据政府规定的排污量进行管理。

二、向大气排放污染物时，基建办公室应当按规定统计企业拥有的污染物排放设施，处理设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度。排放污染物的种类、数量、浓度有较大改变时，应当及时更新。

三、新、扩、改建工程的大气污染防治项目必须执行环保“三同时”及本制度第五章相关条款。

四、各单位必须保证大气污染防治设施的正常运行。

第三十条 防治废气、烟粉尘污染

一、各单位在生产工艺中易产生无组织的部位或场所，必须采取相应措施收集和处理，在达到国家规定环保要求内，做到达标排放。

二、禁止在院区焚烧橡胶、塑料、枯草、落叶、垃圾及其它产生有毒有害气体或恶臭气体的物质，各单位有责任教育其职工遵守上述规定。

三、道路保洁清扫应当防治扬尘污染，清扫后的粉尘及垃圾及时运走。

第七章 水污染防治管理办法

第三十一条 水污染防治监督管理

一、合理安排生产，对产生废水污染的工艺、设备逐步进行调整和技术改造。采取综合防治的措施，合理利用水资源，减少废水的排放量。

二、排放污水时，基建办公室应当按规定统计企业拥有的污染物排放设施、处理设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供水污染防治方面的技术资料。排放污染物的种类、数量、浓度有较大改变时，应当及时更新。

三、新、扩、改建工程的水污染防治项目必须执行环保“三同时”及本制度第五章相关条款。

四、必须保证污水处理站的正常运行。

五、出现水污染事故后，综合管理办公室应立即采取措施，减轻或消除污染，并向领导报告，再向政府部门报告。

第八章 固体废物管理办法

第三十一条 定义

固体废物：指在生产建设、日常生活和其它活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物物质。

生活垃圾：是指在日常生活中或者为日常生活服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

第三十二条 固体废物污染环境的防治

一、产生固体废物时应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。

二、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，必须采取措施，防扬散、防流失、防渗漏；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

三、应当根据经济、技术条件对产生的工业固体废物积极回收利用。

四、需在指定地点倾倒垃圾，垃圾分类，及时清理，禁止随意扔撒或堆放各种垃圾。

第九章 环境污染事故管理办法

第三十三条

定义：本办法所称环境污染事故，是指由于违反操作规程致使污染物大量外泄的行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，院区环境受到影响，员工身体健康受到危害，造成不良社会影响的突发性事件。

第三十四条 环境污染事故根据类型可分为水污染事故、大气污染事故、噪声危害事故、固体废弃物污染事故、有毒化学品污染事故、放射性污染事故等。

第三十五条 环境污染事故依据程度分为：

一、一般环境污染事故

（一）定义：指由于管理不当、操作失误或环保设施使用不当，造成污染物排放超标 1 倍以上（含 1 倍），3 倍以下（不含 3 倍），或造成直接经济损失 1 万元以下（不含 1 万元）的。

（二）处罚措施：视情节轻重，对直接责任人予以 100 元以上至 500 元以下经济处罚。

二、较大环境污染事故

（一）定义：凡符合下列情形之一者，为较大环境污染事故：

1、污染物排放超标 3 倍（含 3 倍）以上，5 倍以下（不含 5 倍），或造成经济损失在 1 万元以上 5 万元以下（不含 5 万元）的事故。

2、人员发生中毒症状。

3、因环境污染引起冲突。

4、对环境造成一定程度的危害。

（二）处罚措施：视情节轻重，对直接责任人予以 500 元以上至 1000 元以下经济处罚，并移送公安机关处理。并对其直接主管视情节轻重予以 100 元以上至 500 元以下经济处罚。

三、重大环境污染事故

（一）定义：凡符合下列情形之一者，为重大环境污染事故：

1、污染物排放超标 5 倍（含 5 倍）以上，10 倍以下（不含 10 倍），或造成经济损失在 5 万元以上 10 万元以下（不含 10 万元）的事故。

2、人员发生明显中毒症状、辐射伤害或可能导致伤残后果。

3、因环境污染对周边环境造成较大影响。

（二）处罚措施：视情节轻重，对直接责任人予以 1000 元以上至 5000 元以下经济处罚，

并对直接主管视情节轻重予以 500 元以上至 1000 元以下经济处罚。对分管环保的领导予以 100 元以上至 500 元以下经济处罚。涉及违法犯罪的，相关责任人移送公安机关处理。

四、特大环境污染事故

（一）定义：凡符合下列情形之一者，为特大环境污染事故

- 1、污染物排放超标 10 倍（含 10 倍）以上或造成经济损失在 10 万元以上的事故。
- 2、人群发生明显中毒症状。
- 3、人员中毒死亡。
- 4、因环境污染使当地经济、社会的正常活动受到严重影响。
- 5、对环境造成严重危害。

（二）处罚措施：视情节轻重，对直接责任人作出 5000 元以上至 20000 元以下的经济处罚，对直接主管视情节轻重予以 1000 元以上至 3000 元以下的经济处罚，对分管环保的领导予以 500 元以上至 1000 元以下的经济处罚。涉及违法犯罪的，相关责任人移送公安机关处理。

第三十六条 事故的报告

一、环境污染事故发生后，责任者或最先发现人，必须立即报告综合管理办公室，有关领导必须及时采取措施，组织抢救，保护现场，防治事故扩大，同时立即上报单位领导。属较大环境污染以上的事故，应在两个小时内报至法人，重大或特大污染事故经过法人确认后，48 小时之内报至上级行政环境保护管理部门。

二、发生环境污染事故，由产生污染单位填写《环境污染事故报告单》（见附件），除留存外，送至法人一份，送达时间不得迟于事故发生后的 48 小时。

第三十七条 事故的调查

一、在发生环境污染事故后，应立即组织有关部门成立调查组，进行事故的调查分析。事故的调查与确认，按事故的严重程度分级负责进行：一般环境污染事故，由基建办公室负责；较大环境污染事故，由基建办公室会同有关部门组织调查与确认；重大和特大污染事故，由法人直接负责组织调查。

二、在事故调查中，要通过现场调查和必要的技术分析、鉴定或试验，查明下列事项：

- 1、事故发生的准确时间、具体地点或部位。
- 2、造成污染事故的污染源，主要污染物质。
- 3、危害程度，人员或动植物受害情况，经济损失数额等。

4、事故发生前生产情况，导致事故发生的起因，作业人员作业时的工艺条件、操作法设备工作参数（如压力、温度、流量）。设备有无缺陷、操作是否正常，事故发生前有无异常反映和征兆。

5、事故现场的照片资料等。

三、事故调查组在查明事故有关情况后进行事故分析时，应从直接原因入手，逐步深入到间接原因，从而掌握事故的全部原因，确认事故危害程度和事故发生的直接责任者、主要责任者或领导责任者。

第三十八条 事故的责任分析及处理

一、通过事故的调查分析，根据事故发生的直接和间接原因、事故危害程度等，提出对事故责任单位或责任者的处理意见。

（一）由于下列原因之一造成事故的，应当追究直接责任者和主要责任者的责任，并视情节轻重予以适当经济处罚。

- 1、违章指挥或违章作业。对违规指挥者或违规作业者予以 200 元以上 1000 元以下处罚。
- 2、违反工艺操作规程，野蛮操作。对违规操作者予以 200 元以上 1000 元以下处罚。
- 3、设计、施工、安装上的失误。对相关失职者予以 200 元以上 2000 元以下处罚。

（二）由于下列原因之一造成事故的，应当追究责任单位领导和有关部门责任人的责任。

1、下达和公布的指示、命令、决定以及规章制度等违反国家和地方政府颁布的环境保护法规、标准、规定。

2、环境保护等规章制度不健全，无章可循的。

3、设备超过检修期、超负荷运行或设备、设施有缺陷又未采取措施的。

4、生产设备和环境保护设施在计划检修和保养时，对设备设施中残余污染物未经妥善安置和处理，随意排放的。

5、新建、扩建、改建和技术改造项目，违反国家关于建设项目环境保护“三同时”规定，擅自投产使用的。

6、对已发现的事故隐患不采取积极有效措施，从而导致事故的发生或发生事故后仍未采取措施造成污染的扩大或蔓延的。

二、对发生事故的单位和责任者，根据情节轻重予以经济处罚。

三、有下列情节之一者，对有关人员进行经济处罚。

1、发生事故后隐瞒不报、虚报或故意推迟报告的。对直接责任人予以 100 元以上至 1000 以下处罚。

2、在事故调查中，隐瞒事故真相，弄虚作假，甚至嫁祸于人的。对直接责任人予以 500 元以上至 2000 以下处罚，涉及违法犯罪的移送公安机关。

3、事故发生后，由于渎职，不积极采取措施造成污染事故扩大和蔓延的。对直接责任人予以 1000 元以上至 5000 以下处罚。

4、违反本办法规定的程序，滥用职权，擅自处理或袒护、包庇事故责任者的。对直接责任人予以 5000 元以上至 10000 以下处罚，涉及违法犯罪的，将相关责任人移送公安机关处理。

第三十九条 确定污染事故依据

确定污染事故的程度以国家和地方下达的排放标准为依据。

第十章 附则

第四十条 本制度由综合管理办公室负责解释。

附件：

麻城市达富石业有限公司污染事故报告单

事故发生起止时间：

事故污染地区：

事故性质（责任、非责任、破坏）：

事故类别（废水、废气、噪声、固废、其他）：

事故程度（一般、较大、重大、特大）：

造成事故的部门和个人：

事故简要经过：

填报部门：	部门负责人：
-------	--------

危险废物管理承诺书

我公司于湖北省黄冈市麻城市中部石材产业园 L09 号（南湖辖区）建设“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”，运营期间会产生相关危险废物。

为防止产生的危险废物对周边环境造成影响，我公司承诺将按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，与有相应处理资质的单位签订危废处置协议，确保危险废物全部交予相应资质单位安全处置，不随意排放。

特此承诺！

麻城市达富石业有限公司
2024 年 12 月 2 日



合 同 书

甲方：麻城市达富石业有限公司

乙方：湖北省嘉煜新型材料有限公司

现甲方全权委托乙方处理甲方厂内的石材尾粉业务，经协商甲乙双方双方应遵守以下事宜：

一、甲方义务

- 1,处理尾粉工作为有偿业务，甲方付给乙方费用，随市场价格而定。
- 2,甲方提供场地尽量使尾粉干燥，便于长途运输。
- 3,甲方不能随便让其他个人或公司处理尾粉，避免对环境的破坏。
- 4,甲方向乙方购买发票，乙方发票卖出后保证三天之内安排出灰（不可抗拒原因外顺延）

二、乙方义务

- 1,乙方对尾粉的处理方式是作为原材料销售给用灰单位，用灰单位必须提供专门的场地堆积尾粉，保证不泄漏，流失。
- 2,乙方运输的车辆必须符合环保要求，保证运输途中不倾倒，抛洒，泄露。
- 3,乙方提供用粉单位的资质，合同，让甲方清楚，尾粉的去向。
- 4,乙方保证甲方厂内尾粉能及时运走，避免尾粉堆积而影响厂内的正常生产。

三、该合同期限为一年，双方不得无故中断该合同协议，否则任何一方有权要求对方赔偿相关损失。合同到期后，双方若无异议，合同自动延续。

四、甲乙双方共同遵守各项事宜，如有未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方签字（盖章）



乙方签字（盖章）



2024年 2 月 22 日

废水排放情况说明书

麻城市达富石业有限公司在运营期间本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，初期雨水经雨水池处理后用于生产，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池处理后用于农田施肥。且定期维护相关设施保证其正常运行，确保废水不外溢，避免造成污染。

特此说明。

麻城市达富石业有限公司
2024 年 12 月 2 日



生活污水综合利用协议书

鉴于甲方在生产运营过程中会产生生活污水，面临生活污水处理问题，而乙方是甲方厂区周边农田户主，需要相关资源用于农田灌溉、施肥使用，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》的规定，本着消除污染、环境、综合利用、化害为利的方针，本着互利互惠的原则，甲乙双方就甲方厂区生活污水综合利用事宜经协商一致，达成如下协议：

第一条：协议目的

本协议的目的是确保甲方的生活污水得到合理利用减少环境污染，保护生态环境，同时满足乙方 20 亩农田的灌溉、施肥需求，实现双方的互利互惠。

第二条：协议内容

- 1、甲方厂区生活污水必须有序排放，建立标准化粪池，生活污水必须全部排入化粪池。
- 2、甲方负责配合乙方对化粪池内生活污水的清掏，乙方负责定期并及时清掏、运输、接收、处理甲方化粪池内生活污水，并确保化粪池内生活污水不外溢，以免造成污染。
- 3、乙方负责确保灌溉、施肥过程中的水质符合国家和地方标准，并采取措施确保生活污水对农作物和土壤的安全。
- 4、甲方厂区化粪池内生活污水免费提供给乙方用于农田灌溉、施肥使用。
- 5、如因生活污水对农作物造成损害或影响产量，甲方应承担相应责任并赔偿乙方的损失。

第四条：协议期限

本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年，双方可协商续签。

第五条：其他

- 1、本协议一经签订，双方需共同遵守。
- 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，如有未尽事宜，甲乙双方共同协商调整。

甲方：麻城市达富木业有限公司



乙方：林陈艳

电话：152 8013 8303

日期：2024 年 10 月 21 日

日期：2024 年 10 月 21 日

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目（阶段性）
竣工环保验收工况说明

本次验收范围为“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”中“年增产石板材 30 万平方米”，年生产天数为 300 天，折合日产花岗岩石板材 1000m²。验收监测期间，生产设备及环保设施均正常运行，具备验收条件。

本项目监测日期为 2025 年 6 月 22 日-2025 年 6 月 23 日，监测期间生产工况见下表。

表 1 监测期间生产工况及生产负荷情况一览表

产品名称	设计产能	2025 年 6 月 22 日		2025 年 6 月 23 日	
		产能	生产负荷	产能	生产负荷
花岗岩石板材	1000m ² /天	900m ² /天	90%	900m ² /天	90%

特此说明。





湖北华明检测有限公司

检 测 报 告

华明（检）字 202506045

项目名称：麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目
（阶段性）竣工环境保护验收监测

委托单位：麻城市达富石业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 06 月 27 日



声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核无效。
3. 对本检测报告若有异议，请于收到该报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
4. 由委托单位自送样品，本公司仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检测报告专用章确认。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 本报告不得用于商业广告，违者必究。

本公司通讯资料：

公司名称：湖北华明检测有限公司

公司地址：武汉市江夏区经济开发区
藏龙岛长咀村长咀光电子
工业园一期9号厂房1-3层
C座202室

邮政编码：430000

检测报告

一. 任务来源

受麻城市达富石业有限公司委托，湖北华明检测有限公司承担了麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目（阶段性）竣工环境保护验收监测的检测工作。我公司依据国家有关环境监测技术规范 and 检测标准的相关要求，即组织相关技术人员于 2025 年 06 月 22 日~2025 年 06 月 23 日对该项目进行了现场监测，并对采集样品进行分析检测，根据检测结果编制完成该项目检测报告。

二. 检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
无组织废气	○1#上风向	颗粒物	4 次/天 检测 2 天
	○2#下风向		
	○3#下风向		
	○4#下风向		
噪声	△N1 厂界东外 1m 处	厂界噪声	昼间、夜间各 1 次 检测 2 天
	△N2 厂界南外 1m 处		
	△N3 厂界西外 1m 处		
	△N4 厂界北外 1m 处		

注：以上检测方案为客户提供。

三. 检测分析方法、依据及仪器设备

检测类别	检测项目	检测方法及依据	分析仪器设备型号、编号	检出限
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	AUW120D 分析天平 (十万分之一) HMJC-YQ-SY-009	167μg/m³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计 HMJC-YQ-CY-075	/
			AWA6021A 声校准器 HMJC-YQ-CY-039	

四. 质量保证及控制措施

1. 检测过程按照国家相关标准的技术要求执行；
2. 参与本次监测的人员均持有相关监测项目上岗资格证书；
3. 所使用仪器、设备均经计量检定/校准，且在有效期内使用；
4. 严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测；
5. 为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采样、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行；
6. 检测数据和报告均实行三级审核。

五. 检测结果

5.1 无组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果(mg/m ³)					参考限值(mg/m ³)
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	最大值	
2025.06.22	○1#厂界上风向	颗粒物	0.257	0.263	0.281	0.252	0.281	1.0
	○2#厂界下风向		0.452	0.433	0.460	0.417	0.460	1.0
	○3#厂界下风向		0.369	0.383	0.346	0.399	0.399	1.0
	○4#厂界下风向		0.485	0.446	0.467	0.523	0.523	1.0
2025.06.23	○1#厂界上风向	颗粒物	0.229	0.265	0.214	0.242	0.265	1.0
	○2#厂界下风向		0.347	0.361	0.340	0.377	0.377	1.0
	○3#厂界下风向		0.351	0.348	0.327	0.369	0.369	1.0
	○4#厂界下风向		0.457	0.413	0.479	0.484	0.484	1.0

气象参数

采样日期	采样频次	气温(℃)	气压(kPa)	湿度(%)	风速(m/s)	风向
2025.06.22	第 1 次	25.1	99.9	60	2.1	南
	第 2 次	24.2	99.8	59	2.2	
	第 3 次	23.8	99.8	58	2.0	
	第 4 次	22.2	99.8	60	2.3	
2025.06.23	第 1 次	25.2	99.8	63	2.2	南
	第 2 次	26.3	99.9	64	2.1	
	第 3 次	27.1	99.9	64	2.3	
	第 4 次	25.2	99.9	64	2.5	
备注	本次检测限值由客户提供，限值执行标准：颗粒物参考《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 标准限值。					

5.2 噪声检测结果

采样日期	检测点位	主要噪声	测量时段		检测结果 Leq[dB(A)]	参考 限值 [dB(A)]
2025.06.22	△N1 厂界东外 1m 处	生产噪声	13:20-13:30	昼间	58.8	65
		生产噪声	22:01-22:11	夜间	48.1	55
	△N2 厂界南外 1m 处	交通噪声	13:35-13:55	昼间	65.5	70
		交通噪声	22:16-22:36	夜间	54.1	55
	△N3 厂界西外 1m 处	交通噪声	14:20-14:40	昼间	67.1	70
		交通噪声	22:40-23:00	夜间	51.9	55
	△N4 厂界北外 1m 处	生产噪声	15:35-15:45	昼间	59.2	65
		生产噪声	23:06-23:16	夜间	49.6	55
2025.06.23	△N1 厂界东外 1m 处	生产噪声	13:40-13:50	昼间	60.8	65
		生产噪声	22:58-23:08	夜间	50.6	55
	△N2 厂界南外 1m 处	交通噪声	13:55-14:15	昼间	61.1	70
		交通噪声	23:10-23:30	夜间	53.3	55
	△N3 厂界西外 1m 处	交通噪声	14:19-14:39	昼间	60.6	70
		交通噪声	23:34-23:54	夜间	52.2	55
	△N4 厂界北外 1m 处	生产噪声	14:48-14:58	昼间	60.2	65
		生产噪声	23:58-00:08 次日	夜间	50.1	55
备注	1.2025.06.22：天气状况：阴；检测期间最大风速：昼间：1.7m/s，夜间：2.1m/s。 2.2025.06.23：天气状况：阴；检测期间最大风速：昼间：1.9m/s，夜间：2.3m/s。 3.本次检测限值由客户提供，限值执行标准：△N2~N3 参考《工业企业厂界环境 噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4 类，其他参考《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB 12348-2008) 3 类。					

车流量观测结果

检测点位	道路名称	检测时段		观测结果(辆/20min)		
				大型车	中型车	小型车
△N2 厂界南 外 1m 处	厦门路	2025.06.22	昼间	17	2	21
			夜间	9	2	11
		2025.06.23	昼间	12	4	17
			夜间	7	4	12
△N3 厂界西 外 1m 处	华建路	2025.06.22	昼间	19	6	15
			夜间	8	3	8
		2025.06.23	昼间	15	2	13
			夜间	9	1	10

编制 徐欣松 审核 游海航 签发 倪利峰
 日期 2025.06.27 日期 2025.6.27 日期 2025.6.27

报告结束

附件 1 质量控制措施


表 1 全程序空白样检测结果统计表

样品类型	检测项目	检测结果	单位	评价
无组织废气	颗粒物	ND	mg/m ³	合格

表 2 声级计校准结果统计表

采样日期	检测前校准示值 (dB(A))	检测后校准示值 (dB(A))	检测前后校准示值 偏差 (dB(A))	检测前后校准示值偏 差允许范围 (dB(A))	评价
2025.06.22	93.7	93.7	0.0	≤±0.5	合格
2025.06.23	93.7	93.7	0.0	≤±0.5	合格

附图 1 检测点位图

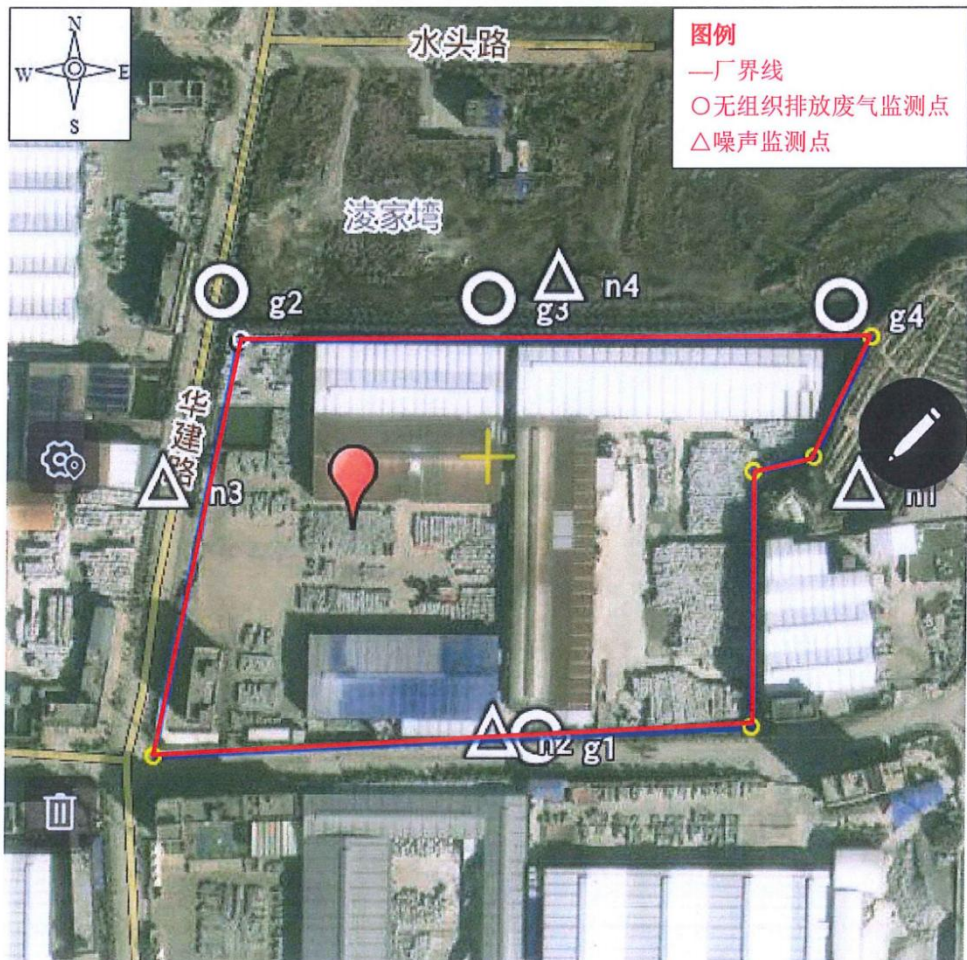

附图 2 现场检测照片



图 1: O1#上风向



图 2: O2#下风向



图 3: O3#下风向



图 4: O4#下风向



图 5: Δ N1 厂界东外 1m 处



图 6: Δ N2 厂界南外 1m 处



图 7: $\triangle N3$ 厂界西外 1m 处

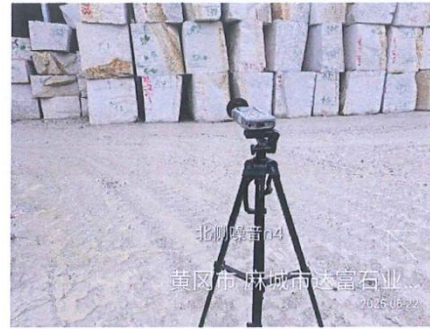


图 8: $\triangle N4$ 厂界北外 1m 处

华明检测

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目（阶段性）
其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目在实施过程中，按照国家建设项目环境保护“三同时”制度，基本落实了环评报告表及其审批文件中提出的污染防治措施。环评报告表中，环保投资总概算为 60 万元，实际环保投资为 36 万元。

1.2 施工简况

项目在建设过程中，对项目产生的废水、废气、噪声及固体废物的处理安装布置相应的措施。项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目于 2025 年 6 月竣工并开始调试，2025 年 6 月委托湖北华明检测有限公司进行监测，正式启动验收工作，湖北华明检测有限公司对项目的废气、噪声进行监测。验收报告于 2025 年 7 月完成并取得验收意见。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业制定了较为完善的保护管理规章制度，配备了专门的环境管理人员协调公司与环保部门的工作，并按照环境保护管理规章制度对公司进行环境管理。

（2）环境风险防范措施

企业已制订完善的环境风险应急预案并进行备案。

（3）环境监测计划

企业按照环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，并按计划进行监测，监测结果均达标。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目环评以厂区设置 80m 防护距离，验收阶段该防护距离内无居民住宅等环境保护敏感目标，满足相关要求。项目不涉及居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

根据验收意见，建设项目竣工验收合格，各项环保措施已落实到位，无需整改。

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2025 年 7 月 2 日，麻城市达富石业有限公司根据麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位，同时特邀 2 位专家组成验收小组（具体名单附后）对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目，选址于湖北省黄冈市麻城市中部石材产业园 L09 号，新增大切机 12 台及其他加工设备，配套环保设施，年增产石板材 50 万平方米，即本项目建成后全厂年产石板材 280 万平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

麻城市达富石业有限公司现有工程包括“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”，年产石板材 230 万平方米，现有工程环保手续履行情况见下表。

表 1 现有工程环保手续履行情况一览表

日期	环保手续类型	环保手续履行情况
2018.04.27	环境影响评价	原麻城市环境保护局下达了《关于麻城市达富石业有限公司石材加工项目环境影响报告表的批复》（麻环审[2018]47 号）
2018.05.31	竣工环境保护验收	麻城市达富石业有限公司进行了“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”自主竣工环境保护验收（分阶段验收），并于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台进行公示
2020.07.15	排污许可	麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证首次申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2020.07.15-2023.07.14
2020.12.08	竣工环境保护验收	麻城市达富石业有限公司进行了“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”自主竣工环境保护验收（整体验收），并于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台进行公示
2023.01.06	突发环境事件应急预案备案	麻城市达富石业有限公司签署发布了突发环境事件应急预案，该预案经黄冈市生态环境局麻城市分局予以备案并取得《麻城市达富石业有限公司突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：421181-2022-110-L）
2023.07.17	排污许可	麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证延续申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2023.07.15-2028.07.14
2024.07.11	排污许可	麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证重新申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2024.07.11-2029.07.10

现有工程环评批复如下：该项目位于中部麻城产业园 L09 号，总占地面积 66733 平方米。主要建设厂房、办公用房、职工宿舍等配套设施，购置大切机、红外线机等生产设备。本项目以矿山开采的花岗岩石料为原料，进行石材的切割、打磨、染色、年产石板材 260 万平方米（染色板材 30 万平方米），项目总投资 15000 万元，其中环保投资 120 万元。

应市场需求，现有工程从未进行染色板生产，故未建设生产染色板相关构筑物、设备及设施，无染色板产品产能；现有工程于建设过程中将用地面积由原来的 66733m² 扩增至

90200m²（135.3 亩）；并已按照年产石板材（白板）230 万 m² 进行了现有工程竣工环境保护验收（整体验收），未来也不进行染色板生产。

麻城市达富石业有限公司现随着市场需求的扩大，投资 1500 万元建设“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”，新增大切机 12 台及其他加工设备，配套环保设施，年增产石板材 50 万平方米。即本项目建成后全厂年产石板材 280 万平方米。

2025 年 4 月 23 日，该项目环境影响报告表通过黄冈市生态环境局麻城市分局审批（麻环审[2025]18 号）；2025 年 7 月 7 日，麻城市达富石业有限公司申请取得排污许可证（排污许可证号：91421181MA491GBJ7P001Q），包含本项目分阶段验收建设内容，有效期至 2030 年 7 月 6 日。

项目从立项至调试过程中均无环境投诉、违法或处罚等记录。

（三）投资情况

项目实际总投资 900 万元，环保投资 36 万元。

（四）验收范围

本次验收范围为“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”中“年增产石板材 30 万平方米”的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。

二、工程变动情况

与原环评及批复建设内容相比，本项目设备数量稍有变动，其他无变动。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目湿法加工废水、地面冲洗废水经沉淀池混凝沉淀后回用于生产，车辆冲洗废水经洗车槽处理后回用于洗车，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，抑尘用水全部蒸发损耗。

（二）废气

本项目废气主要为湿法加工粉尘、喷砂粉尘、运输粉尘、堆场粉尘等。湿法加工粉尘采用湿法加工、喷淋洒水，喷砂粉尘采用滤芯式除尘器等污染治理措施后无组织排放，运输扬尘及堆场粉尘采用洒水抑尘、配置洗车槽等污染治理措施后无组织排放。

（三）噪声

本项目对主要噪声源采取吸声、隔声、隔振综合治理措施后，厂界噪声可达标，车辆限速，禁止鸣笛或无故加油门，在醒目处设立警示标志。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物。一般固体废物暂存于废料堆场及

尾渣堆场，定期交由相关单位回收利用。危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

本项目生产废水经沉淀池混凝沉淀后回用于生产，不外排，生产回用水对水质无具体要求，且无相关标准或规范；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。

（二）废气

根据验收监测结果可知，本项目颗粒物无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（三）噪声

根据验收监测结果可知，本项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准限值。

（四）固废

本项目一般固体废物暂存于废料堆场及尾渣堆场，定期交由相关单位回收利用。危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。上述废物去向可行，分类存放、妥善保管。建设方对固废统一收集、安全存放，不会对环境造成二次污染。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气环保设施处理效果好，对环境的影响较小；本项目噪声不会对周边环境产生明显影响；本项目固废经相关单位处理后对环境的影响较小。故本项目的建设对环境的影响较小。

六、验收结论

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境保护手续总体齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，根据《验收监测报告》，项目主要污染物能够达标排放，在进一步完善下述提出的各项整改措施和建议后，项目符合建设项目竣工环保验收条件。

七、后续要求

（一）项目需进一步完善的内容

（1）进一步规范危废暂存间并按标准化建设，建立健全的危废管理制度，补充相关台账及记录；

（2）进一步加强企业环保设施日常维护和运行管理，确保环保设施正常运行及污染物全面稳定达标排放。

(二) 《验收监测报告表》需进一步修改完善的内容

- (1) 补充企业环境风险防范及应急措施落实情况；
- (2) 补充项目环保设施相关照片；
- (3) 完善相关附图附件。

八、验收人员信息

具体信息见签到表。

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目

竣工环境保护验收小组


2025 年 7 月 2 日

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目（阶段性）
竣工环境保护验收工作组人员名单


组成部门	单位名称	姓名	职务/职称	联系方式	签名
编制单位	麻城市达富石业有限公司	杜武富	主要负责人	156	杜武富
专业技术专家	武汉中地格林环保科技有限公司	师懿	高工	136	师懿
	武汉智汇元环保科技有限公司	余祺	高工	156	余祺

麻城市地图


基础要素版

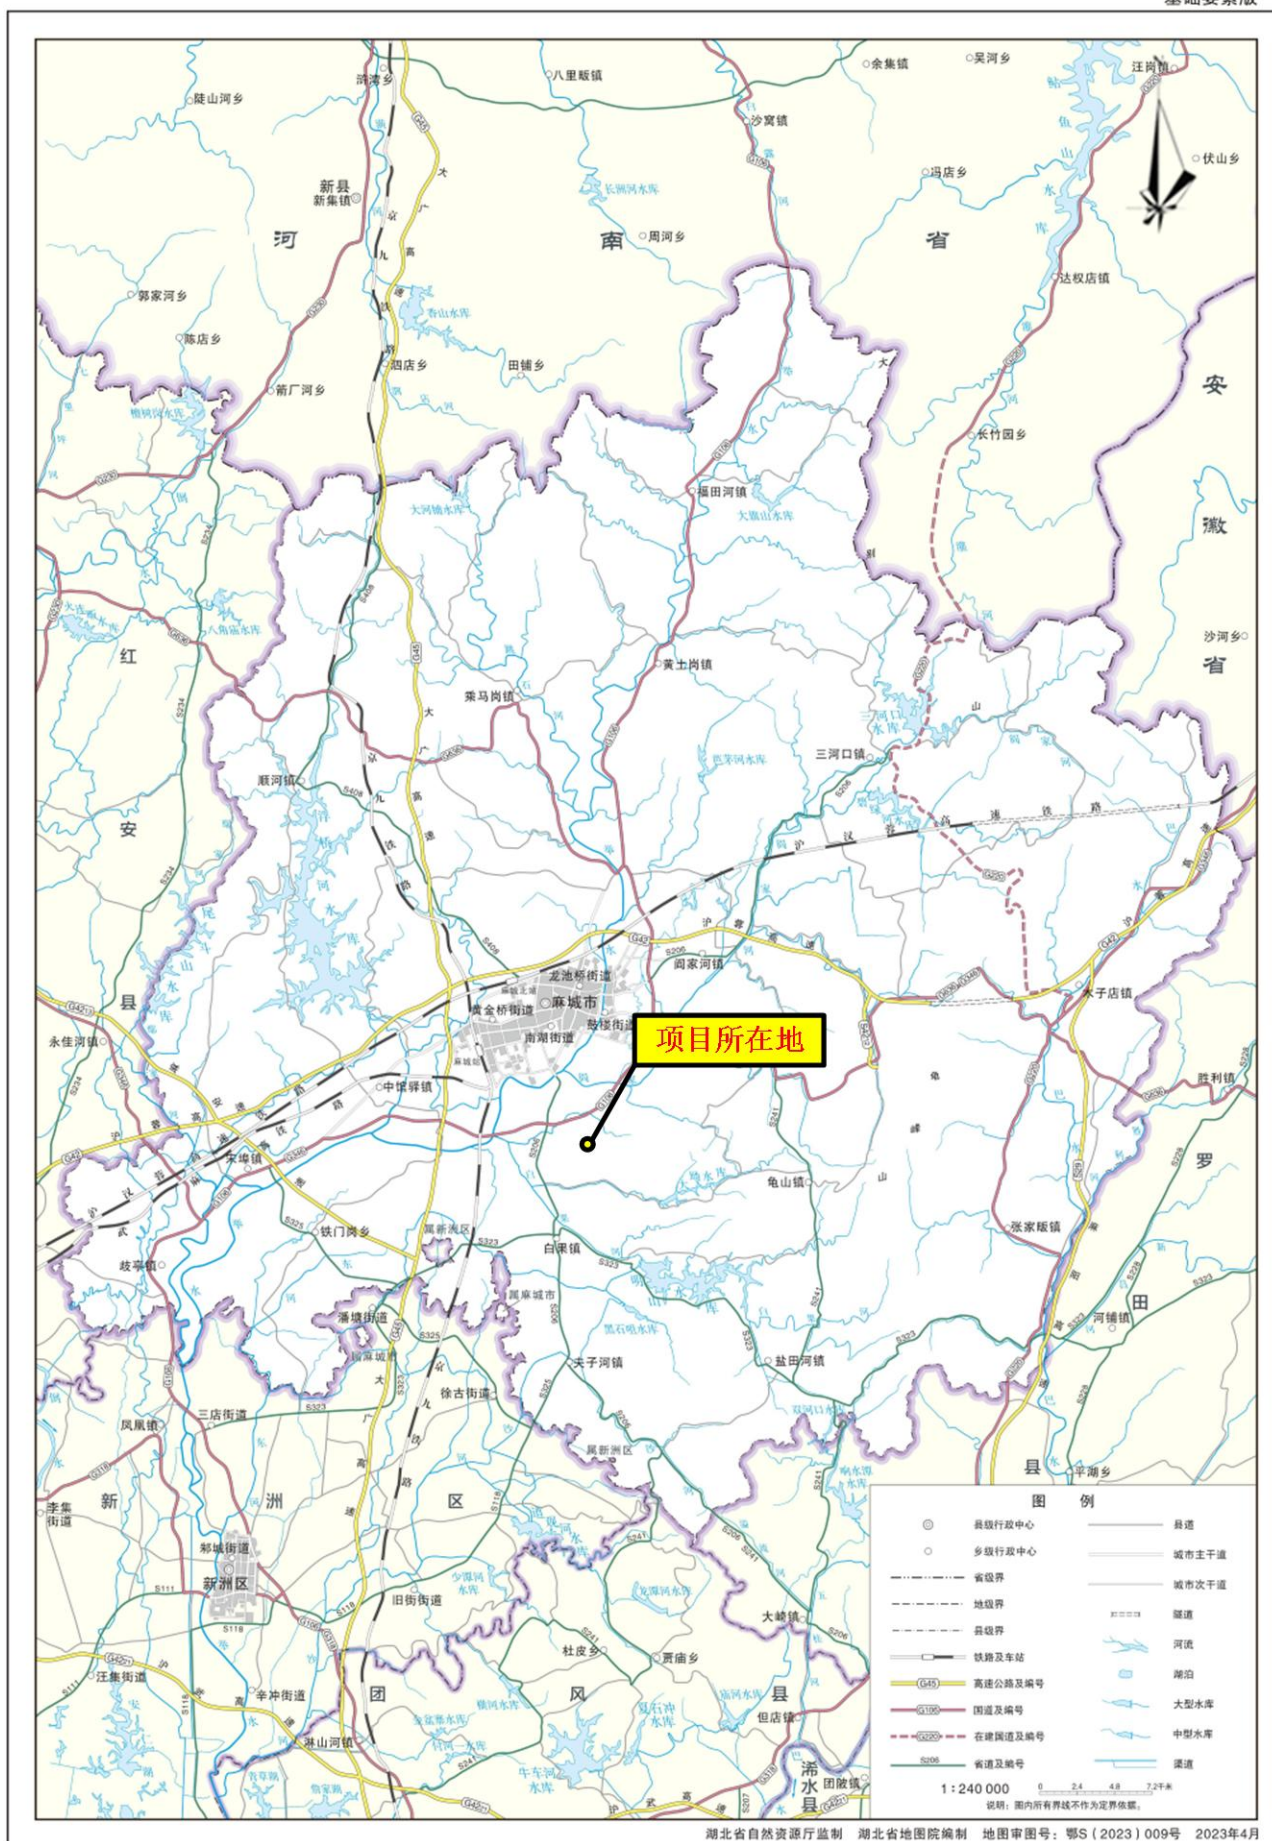

附图1 地理位置图

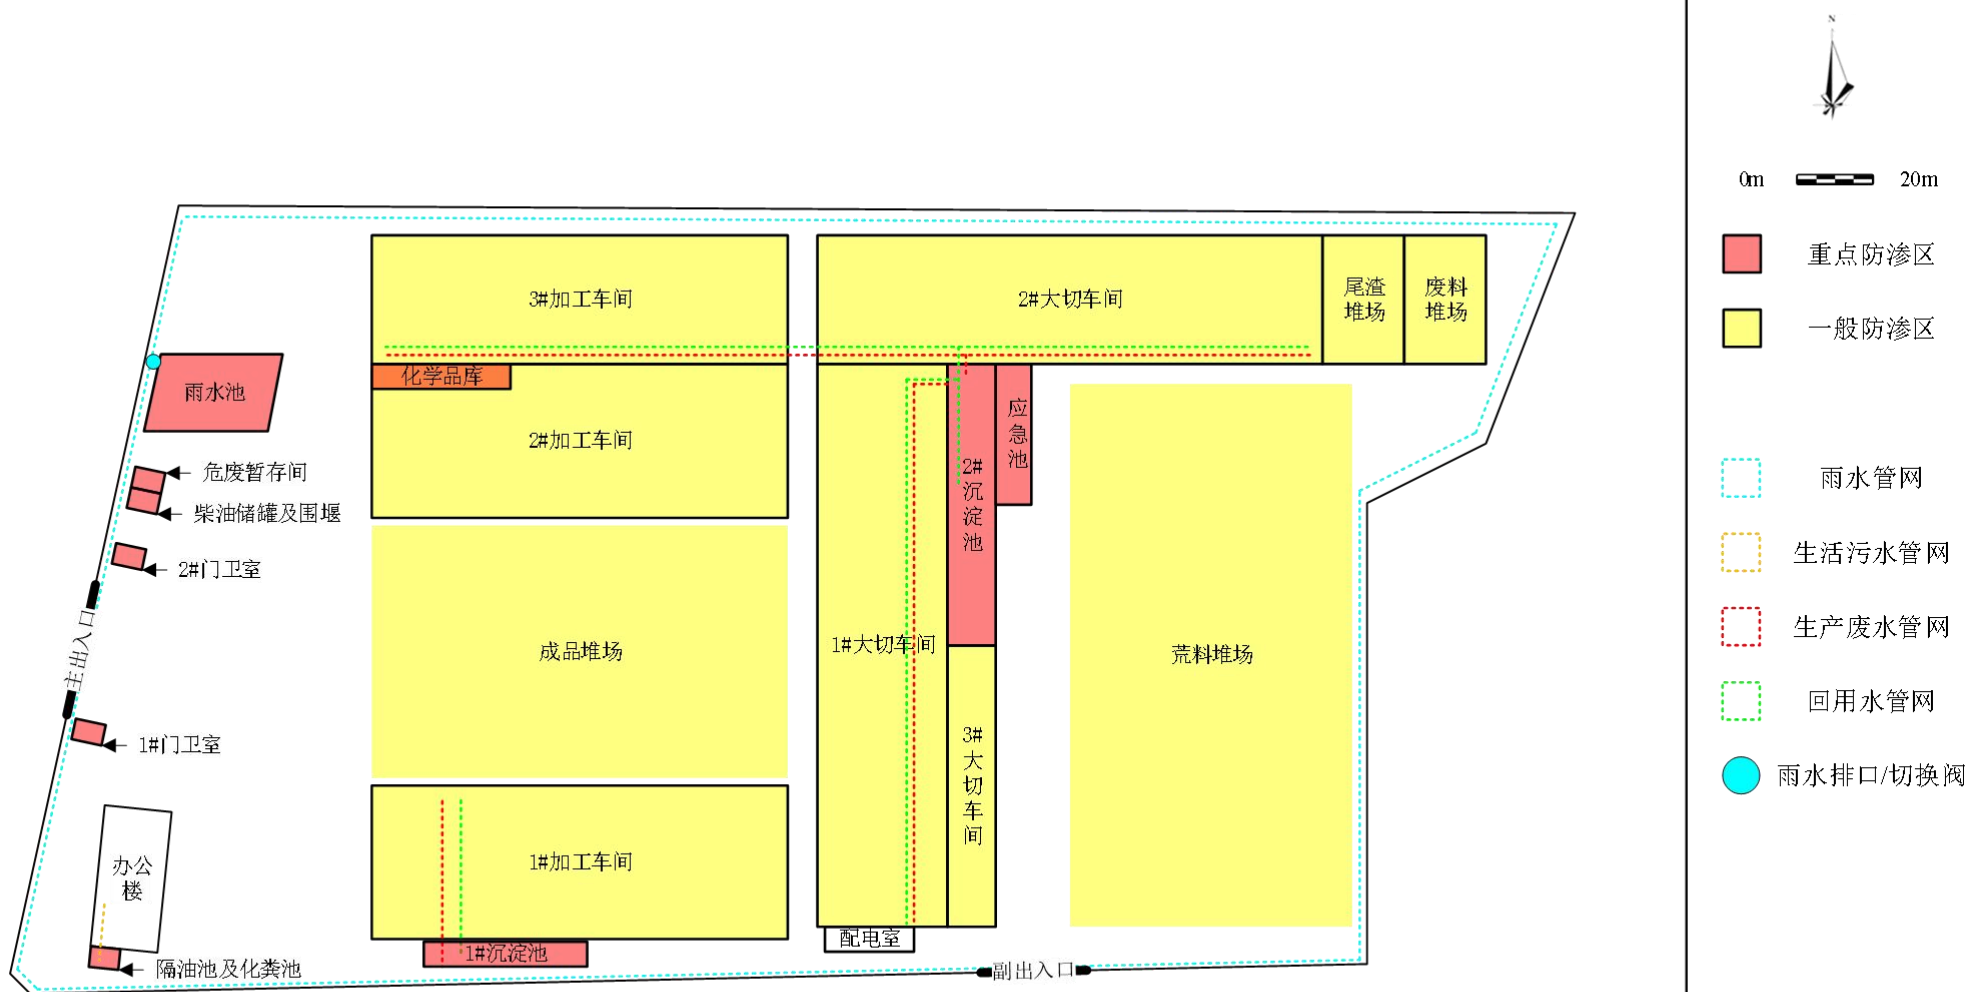

附图 2 平面布置图

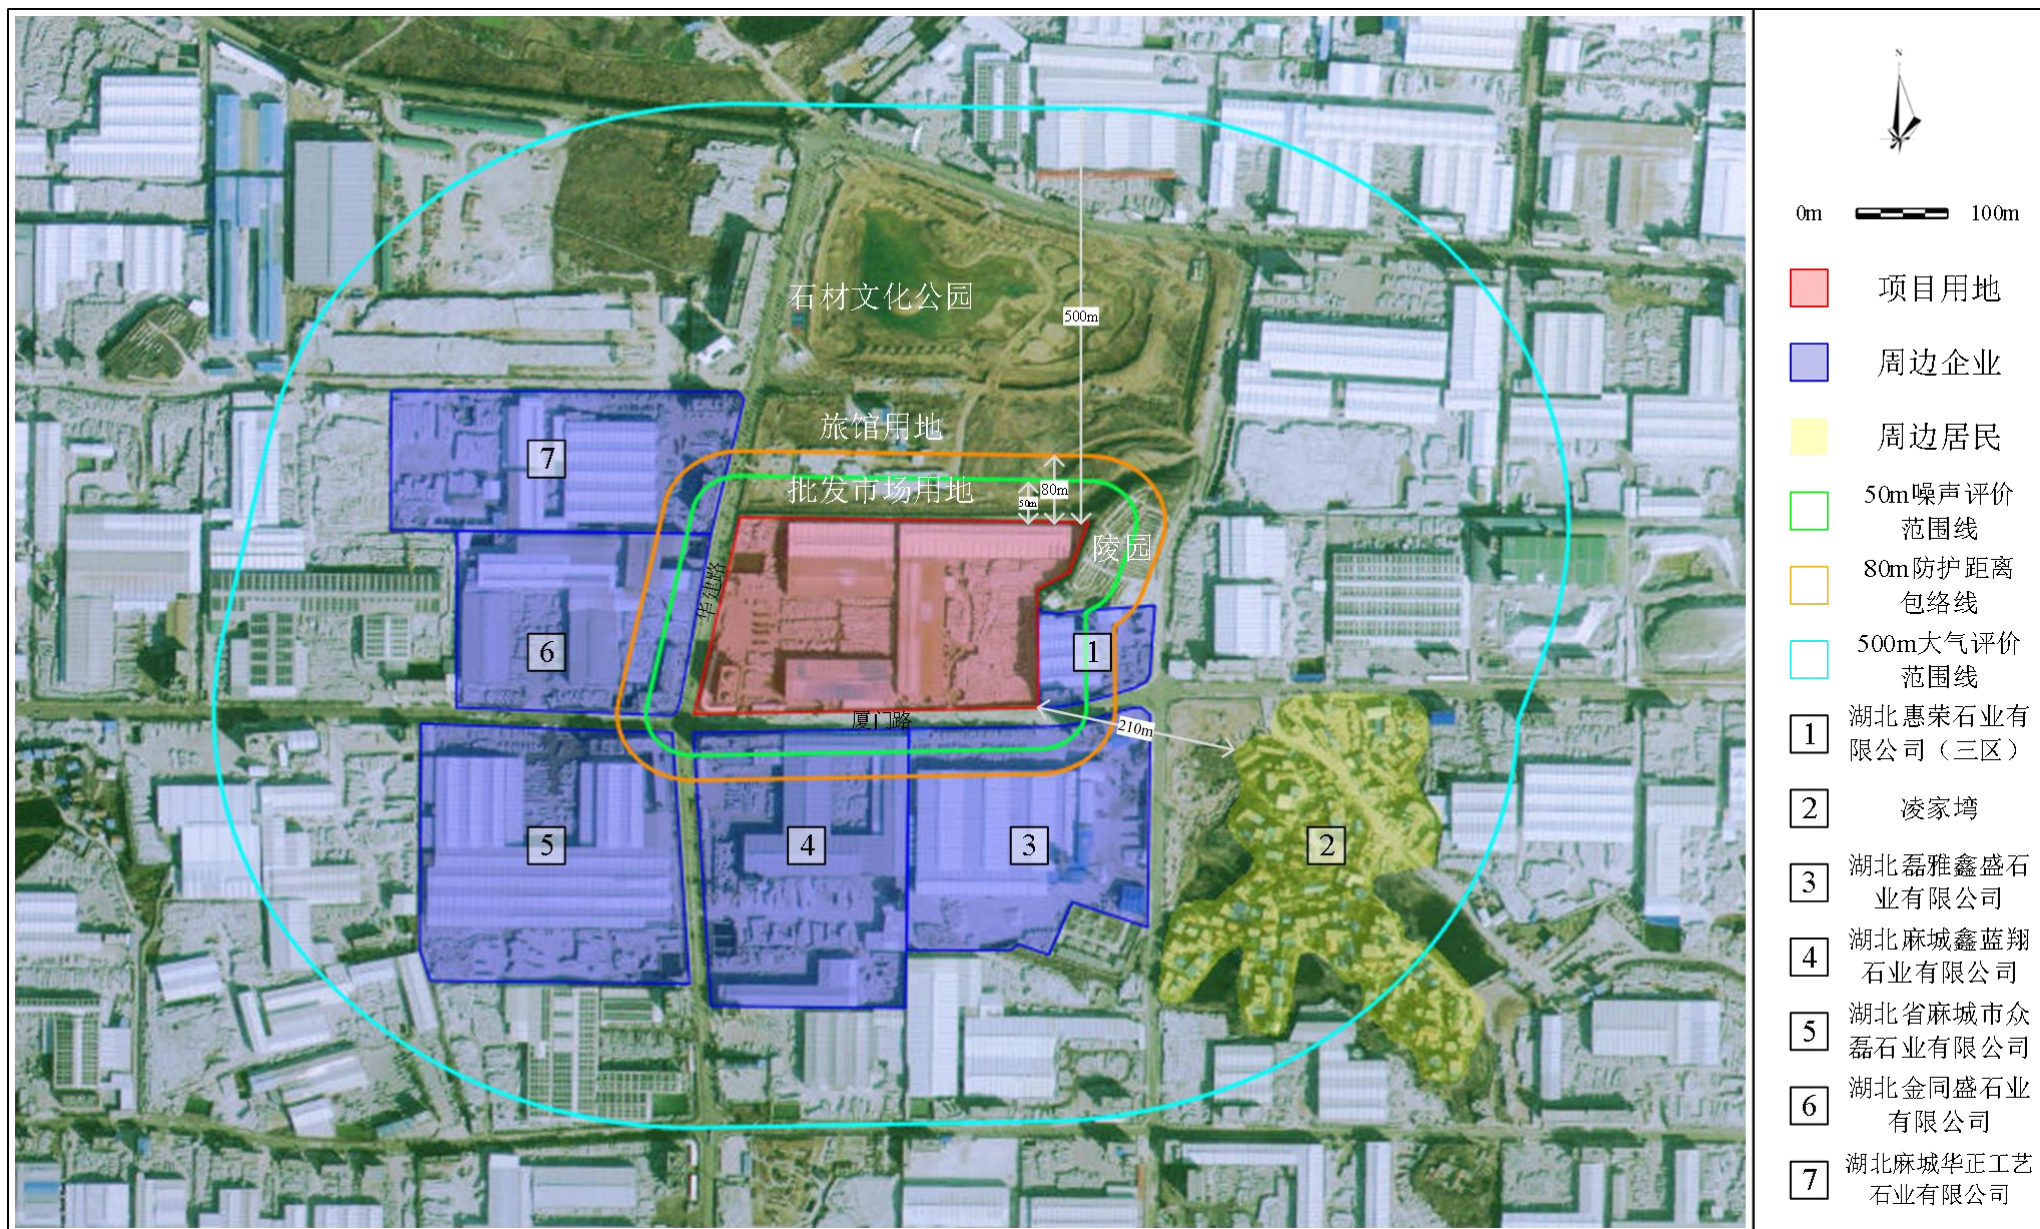

附图3 周边关系图



附图 4 监测点位图
